



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-03/19-01/70

URBROJ: 65-19-02

Zagreb, 4. travnja 2019.




Hs\*\*NP\*022-03/19-01/70\*65-19-02\*\*Hs

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA  
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15 i 118/18) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. travnja 2019. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Krstičevića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, dr. sc. Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Tomislava Ivića i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne tajnike u Ministarstvu obrane, te dr. sc. Damira Truta i Antu Delipetra, pomoćnike ministra unutarnjih poslova.

  
**PREDSJEDNIK**  
**Gordan Jandroković**



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**Klasa:** 022-03/19-14/03

**Urbroj:** 50301-29/24-19-2

**Zagreb,** 4. travnja 2019.


**PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**Predmet:** Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Damira Krstičevića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, dr. sc. Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Tomislava Ivića i mr. sc. Zdravka Jakopa, državne tajnike u Ministarstvu obrane, te dr. sc. Damira Truta i Antu Delipetra, pomoćnike ministra unutarnjih poslova.

**PREDSJEDNIK**

  
mr. sc. Andrej Plenković

**IZVJEŠĆE**

**O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA  
I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA  
ZA 2018. GODINU**

## SADRŽAJ

1. Uvod.....	4
2. Analiza Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za razdoblje 2009. – 2018.....	5
3. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu ..8	
3.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj.....	9
3.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja .....	10
3.1.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu .....	16
3.1.1.2. Izvršenje posljednjih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema županije .....	17
3.1.1.3. Cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske.....	17
3.1.1.4. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji .....	19
3.1.1.5. Započinjanje s poslovima razminiranja na 25,3 km <sup>2</sup> zaštićenih i Natura 2000 područja Osječko-baranjske županije .....	20
3.1.2. Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida .....	22
3.1.3. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid .....	23
3.2. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima .....	23
3.3. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova .....	24
3.3.1. Edukacija o opasnostima od mina.....	24
3.3.2. Žrtve mina .....	25
3.4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju.....	27
3.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.....	33
3.5.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita .....	33
3.5.2. Fearless Velebit .....	35
3.5.3. „Karlovac Karst“.....	35
3.5.4. Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta .....	36
3.5.5. Švicarski program pomoći.....	37

3.5.6. <i>INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.</i> .....	41
3.5.7. <i>Provedba projekata financiranih sredstvima pretpristupnih programa IPA-I. komponenta i Prijelaznog instrumenta</i> .....	42
3.6. <i>Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawске konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima</i> .....	44
4. <i>Financiranje plana</i> .....	46
4.1. <i>Financiranje poslova razminiranja</i> .....	48
4.1.1. <i>Donacije</i> .....	49
4.1.2. <i>Razminiranje poljoprivrednog zemljišta</i> .....	50
4.1.3. <i>Razminiranje sredstvima Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede) s pozicije Općekorisne funkcije šuma</i> .....	50
4.1.4. <i>Ukupno realizirana financijska sredstva</i> .....	50
5. <i>Zaključak</i> .....	51
6. <i>Prilozi</i> .....	53
6.1. <i>Prikaz razminiranih područja u 2018. godini po županijama</i> .....	53
6.2. <i>Izvešće o provedbi plan razminiranja vojnih objekata Oružanih snaga u 2018. godini</i> .....	55

## 1. Uvod

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2018. godini, kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i realizirana za tu namjenu.

U Izvješću se, uz utvrđivanje realiziranih ciljeva i njihove analize, ocjenjuje i učinkovitost dosadašnje provedbe strateških ciljeva vezanih uz cjelovito rješavanje minskog problema u Republici Hrvatskoj.

Jedan od ciljeva Izvješća je i potaknuti aktivnosti za stvaranje uvjeta da se sukladno potpisanim konvencijama stvore uvjeti za pravovremeno, učinkovito i cjelovito rješavanje minskog problema Republike Hrvatske.

Osnova za izradu Izvješća je Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na svojoj 86. sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine. Izrada i donošenje Plana utemeljeni su na Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) i Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 120/09).

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.-.2020. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“.

Plan za 2018. godinu je izradio Hrvatski centar za razminiranje uz mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede, Državne uprave za zaštitu i spašavanje te svih minski zagađenih županija u Republici Hrvatskoj.

## 2. Analiza Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za razdoblje 2009. – 2018.

Nacionalni program protuminskog djelovanja (u daljnjem tekstu: Program) je strateški dokument koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine i njegova je svrha da donositeljima odluka, prije svih Ministarstvu financija i Ministarstvu unutarnjih poslova, bude osnova za izradu službenih dokumenata vezanih za protuminsko djelovanje, a Hrvatskom centru za razminiranje osnova za godišnja planiranja.

Programom su utvrđeni ciljevi i načini ostvarenja rješavanja minskog problema Republike Hrvatske s ciljem ispunjenja obveza preuzetih ratifikacijom Konvencije o zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (u daljnjem tekstu: Ottawska konvencija) i Konvencije o kazetnom streljivu.

U Programu je utvrđeno ostvarenje sljedećih 5 strateških ciljeva u razdoblju od 1. siječnja 2009. godine do 1. ožujka 2019. godine:

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske do 2019. godine<sup>1</sup>.
2. Održavanje obilježenosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja minskog problema.
3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.
4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina.
5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.-2020. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“, planirano je u 2018. godini smanjenje minski sumnjivih područja i područja zagađenih isključivo NUS-om za 24,6%.


Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, COM(2010) 715 final, u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, u paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

<sup>1</sup> U razdoblju trajanja Programa, od 2009.-2019. godine s ciljem potpunog uklanjanja minske opasnosti iz Republike Hrvatske, planirano je smanjenje minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) veličine 954,5 km<sup>2</sup>. Za izvršenje tih poslova potrebno je osigurati iz svih izvora financiranja 4.187.000.000,00 kuna

Godina	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukupno planirani poslovi NPPDRH (km <sup>2</sup> )	57,4	75,5	86,5	134,5	139,5	132,5	104,5	86,4	70,2	57	10,5
Planirani poslovi godišnjim planom (km <sup>2</sup> )	57,4	67,05	71,9	67,1	68,1	51,4	104,5	86,4	75,0	56,5	53,0
Ostvareno godišnjim planom (km <sup>2</sup> )	62,6	70	70,4	67,3	71,9	83,8	67,8	41,6	36,5	56,0	

Tablica 2.1. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih ciljeva s ostvarenjem u razdoblju 2009.-2018. godina

U razdoblju od 2009.-2018. godine Nacionalnim programom je utvrđeno smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 944 km<sup>2</sup>, za što je bilo potrebno iz svih izvora financiranja osigurati 4,14 mlrd. kuna. U navedenom razdoblju minski sumnjivo područje ukupno je smanjeno za 627,7 km<sup>2</sup>. Ukupno utrošena financijska sredstva za izvršenje navedenih poslova iznose 3,06 mlrd. kuna.

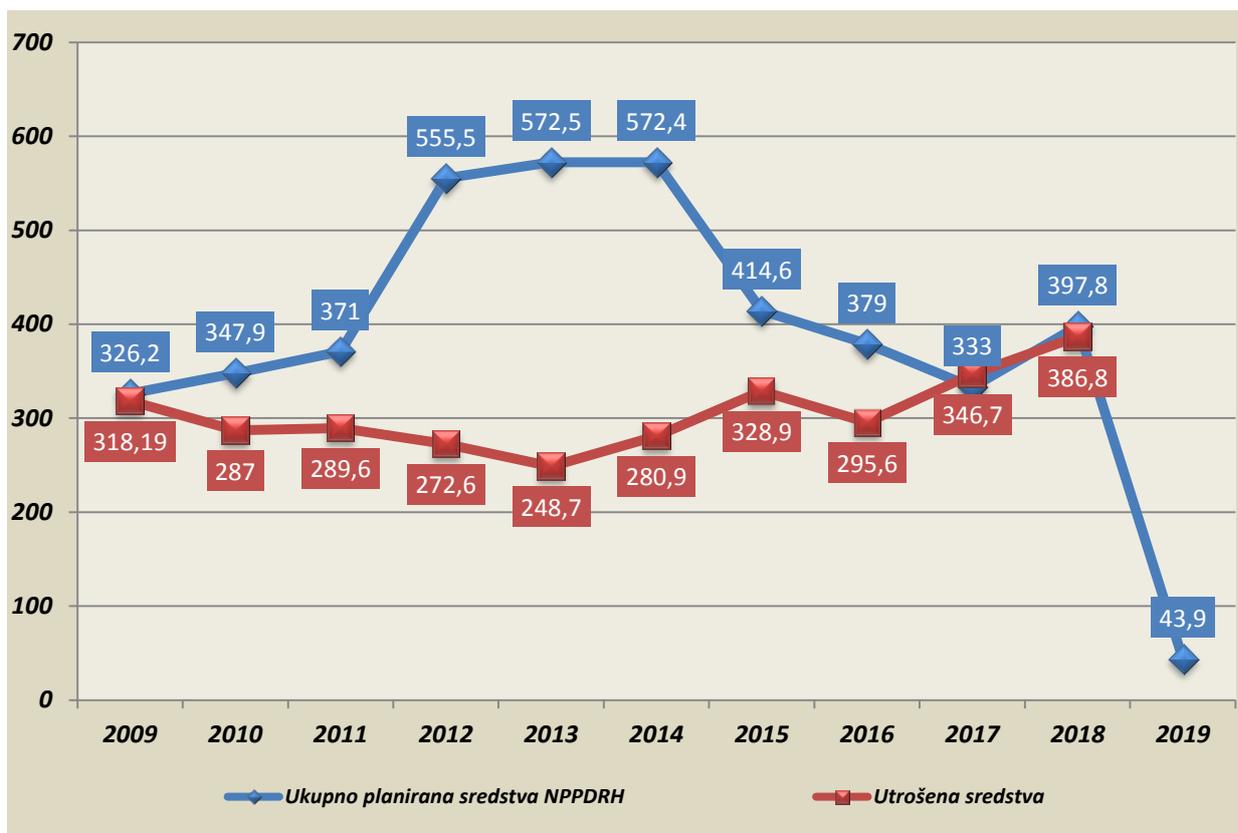

Graf 2.1. Usporedba Nacionalnim Programom utvrđenih financijskih sredstava sa ostvarenjem u razdoblju 2009.-2018. godina

Iz navedenog je razvidno da su ukupna financijska sredstva koja su utrošena u navedenom razdoblju manja za 26% od Nacionalnim programom utvrđenih. U navedenom razdoblju ukupno smanjenje MSP-a je za 33,5% manje od Nacionalnim programom planiranog.

	Planirano Programom	PPD za 2018.	Realizirano
Poslovi koji za cilj imaju smanjenje MSP-a	57	56,5	56
Financijska sredstva (mil. kuna)	271	397,8	386,8

*Tablica 2.2. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih potrebnih financijskih sredstava s osiguranim sredstvima državnog proračuna i ostalim izvorima financiranja za 2018. godinu*

Analiza devetogodišnjeg ostvarenja Programa 2009.-2019. jasno ukazuje da je u navedenom razdoblju provedbe jedino u prvoj godini, godišnja osigurana sredstva za poslove koji imaju za cilj smanjenje MSP-a bila na razini Programom planiranim. U razdoblju 2010.-2014. godišnje realizacije smanjenja MSP-a znatno odstupaju u odnosu na Programom planirane zbog značajno manjeg iznosa osiguranih sredstava na godišnjoj razini. U posljednje četiri godine, planirana i osigurana financijska sredstva su veća od planiranih Programom, ali nisu u cijelosti realizirana. Izvor većih, osiguranih financijska sredstva od planiranih Programom su pretpristupni fondovi EU te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Tijekom provedbe Programa, sukladno gore navedenim pokazateljima, stvorila se potreba za izradom novog strateškog dokumenta, koji će utvrditi uvjete za kapacitiran sustav protuminskog djelovanja s ciljem provedbe poslova razminiranja, tehničkog, općeg i dopunskog općeg izvida u skladu s osiguranim financijskim sredstvima na godišnjim razinama i za cijelosti ispunjavanje obveza iz članka 5. Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima, sadržanog u Ottawskoj konvenciji, nakon 2019. godine u najkraće mogućem vremenu.

### 3. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu

Na dan 1. siječnja 2018. godine ukupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske iznosilo je 411,5 km<sup>2</sup>, prostiralo se unutar 59 gradova i općina u 8 županija i bilo je obilježeno sa 13.544 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava.

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2018. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

#### **CILJ 1.**

**Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida s ciljem smanjenja MSP-a na površini od 56,5 km<sup>2</sup>;**

▪ **PODCILJ 1.1.**

Izvršenje obveze iz članka 4. čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu;

▪ **PODCILJ 1.2.**

Izvršenje posljednjih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema Županije;

▪ **PODCILJ 1.3.**

Cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske;

▪ **PODCILJ 1.4.**

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji;

▪ **PODCILJ 1.5.**

Započinjanje s poslovima razminiranja 25,3 km<sup>2</sup> zaštićenih i Natura 2000 područja Osječko-baranjske županije.

#### **CILJ 2.**

**Održavanje sustava obilježivosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om;**

#### **CILJ 3.**

**Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova;**

#### **CILJ 4.**

**Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju;**

#### **CILJ 5.**

**Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020;**

#### **CILJ 6.**

**Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije -Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.**

### 3.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj

Izvršenje poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj u 2018. godini planirano je na površini od 39,8 km<sup>2</sup>. Usporedo s poslovima razminiranja koji su obavljale pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, Hrvatski centar za razminiranje je planirao provoditi opći, dopunski opći i tehnički izvid na površini od najmanje 16,7 km<sup>2</sup>.

U 2018. godini MSP Republike Hrvatske poslovima razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg i općeg izvida smanjen za 56 km<sup>2</sup>.

Rb.	Vrsta aktivnosti	Planirano za 2018. godinu (km <sup>2</sup> )	Realizirano u 2018. godini (km <sup>2</sup> )
1.	Razminiranje	39,8	48,8
2.	Izvid - opći i tehnički	16,7	7,2
<b>UKUPNO:</b>		<b>56,5</b>	<b>56,0</b>

Tablica 3.1. Smanjenje MSP-a

Red. Broj	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om na dan 01.01.2018. (km <sup>2</sup> )	Smanjenje MSP-a 31.12.2018. (km <sup>2</sup> )
1.	Brodsko-posavska	0,0	0,0
2.	Karlovačka	49,8	3,7
3.	Ličko-senjska	138,2	19,6
4.	Osječko-baranjska	55,7	2,8
5.	Požeško-slavonska	24,0	8,1
6.	Splitsko-dalmatinska	20,1	0,5
7.	Sisačko-moslavačka	70,6	12,2
8.	Šibensko-kninska	22,2	4,1
9.	Zadarska	30,9	5,0
<b>UKUPNO</b>		<b>411,5</b>	<b>56,0</b>

Tablica 3.2. Izvršeno poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida po županijama

Nakon izvršenih poslova razminiranja na 92 idejna plana razminiranja izdana je potvrda o isključenju površina iz minski sumnjivih na površini od 48.826.187 m<sup>2</sup>.

Provedba 65 općih izvida, dopunskih općih izvida i tehničkih izvida rezultirala je izdavanjem potvrda o isključenosti površina iz minski sumnjivih, veličine od 8.606.391 m<sup>2</sup>, ali i uključenjem površina veličine od 1.402.816 m<sup>2</sup>, što čini ukupno smanjenje MSP-a za 7.203.575 m<sup>2</sup>.

**Na dan 31. prosinca 2018. godine MSP Republike Hrvatske iznosi 355.462.926 m<sup>2</sup>, odnosno 355,5 km<sup>2</sup>.**

## 3.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja

Red.br.	Županija	Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om 01.01.2018.	Planirano smanjenje MSP-a razminiranjem	Razminirano	Udio smanjenja MSP-a u odnosu na ukupan MSP županije
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
1	Brodsko-posavska	0	232.977	232.980	0,0
2	Karlovačka	49.758.925	2.637.989	3.238.758	6,5
3	Ličko-senjska	138.209.409	11.340.829	20.035.985	14,5
4	Osječko-baranjska	55.666.338	11.243.826	1.712.448	3,1
5	Požeško-slavonska	23.991.212	2.101.020	6.974.661	29,1
6	Sisačko-moslavačka	70.566.709	6.020.045	12.255.143	17,4
7	Splitsko-dalmatinska	20.141.761	868.824	475.460	2,4
8	Šibensko-kninska	22.227.365	3.009.065	2.651.421	11,9
9	Zadarska	30.930.969	2.375.156	1.249.331	4,0
<b>Republika Hrvatska - ukupno</b>		<b>411.492.688</b>	<b>39.829.731</b>	<b>48.826.187</b>	<b>11,9</b>


Tablica 3.3. Ukupno planirani i ostvareni poslovi razminiranja, po županijama

U 2018. godini od planiranih 39.829.731 m<sup>2</sup> poslovi razminiranja su izvršeni na površini od 48.826.187 m<sup>2</sup>.


Razlog većem ostvarenju je i izdavanje potvrda u 2018. godini za one projekte koji su bili završeni do kraja 2017. godine, ali nije bila napravljena završna kontrola kvalitete i/ili izvršena geodetska izmjera.

U 2018. godini, na projektima koji su završeni i za koje je izdana potvrda, pronađeno je i uništeno 979 komada MES-a i 1.409 komada NUS-a. Najviše MES-a pronađeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je ukupno pronađeno i uništeno 265 komada, od čega najviše protupješačkih mina (u daljnjem tekstu: PPM) tipa PMA-2, PMR-2A, PMA-3, PMR-2AS, PROM-1 te protuoklopnih mina (u daljnjem tekstu: POM) tipa TMRP-6.

Najviše NUS-a pronađeno je i uništeno u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

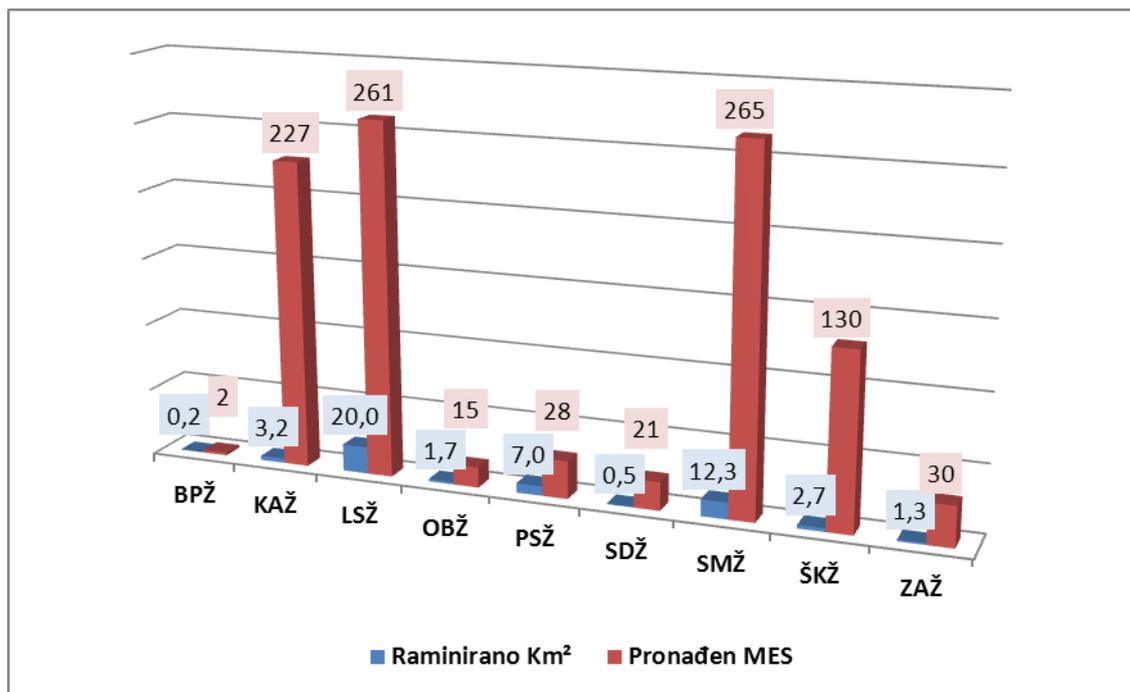

Graf 3.1. Prikaz pronađenih MES-a po županijama

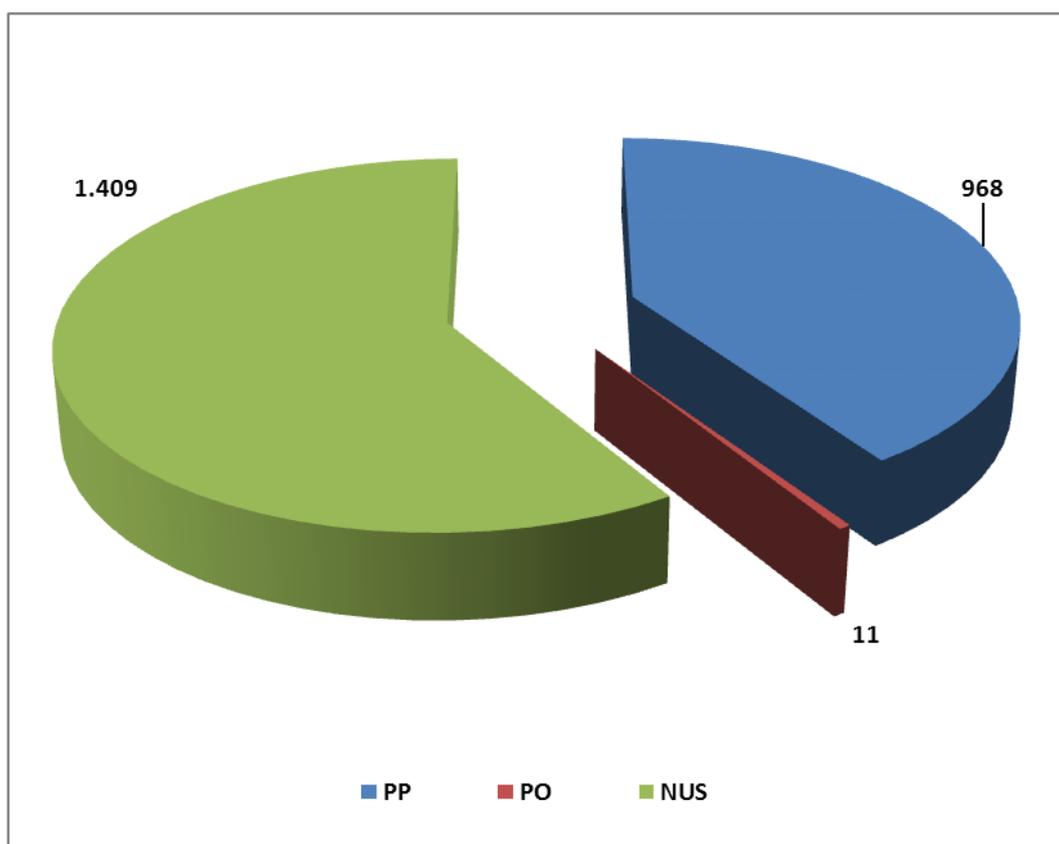

Graf 3.2. Pregled pronađenih MES i NUS

U 2018. godini u Republici Hrvatskoj obzirom na vrstu MES-a najviše je pronađeno i uništeno PPM-a tipa PMA-2 i PMR-2A i POM-a tipa TMRP-6.

Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a 45,5% odnosi se na kazetne bombice tipa KB-1, a preostalih 54,5% na različite vrste streljiva.

Rb.	Županija	Ostvarenje razminiranja u 2018. godini (m <sup>2</sup> )	Pronađena minkoeksplozivna sredstva (kom)		Pronađena neeksplozivna ubojna sredstva (kom)	Ukupno pronađena minkoeksplozivna sredstva i neeksplozivna ubojna sredstva (kom)
			Protupješačke mine	Protuočlopne mine		
1	Brodsko-posavska	232.980	2	0	0	2
2	Karlovačka	3.238.758	227	0	49	276
3	Ličko-senjska	20.035.985	261	0	778	1.039
4	Osječko-baranjska	1.712.448	15	0	1	16
5	Požeško-slavonska	6.974.661	20	8	1	29
6	Splitsko-dalmatinska	475.460	21	0	4	25
7	Sisačko-moslavačka	12.255.143	262	3	548	813
8	Šibensko-kninska	2.651.421	130	0	13	143
9	Zadarska	1.249.331	30	0	15	45
Ukupno		48.826.187	968	11	1.409	2.388
			979			

Tablica 3.4. Broj i vrsta pronađenih MES-a i NUS-a po županijama

Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine poslove pregleda površine psima za detekciju mina, obavljale su pravne osobe ili obrtnici, koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Poslove kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljali su ovlaštene djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje (pirotehničari za kontrolu kvalitete i nadzornici za kontrolu kvalitete) dok je poslove završne kontrole kvalitete obavljalo Povjerenstvo imenovano od ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje (predsjednik Povjerenstva i jedan član iz redova Hrvatskog centra za razminiranje te jedan član iz Ministarstva unutarnjih poslova).

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja, na 7 radilišta utvrđeno je da poslovi razminiranja ne zadovoljavaju propisane uvjete kvalitete te je naloženo ponavljanje – ponovno razminiranje na ukupnoj površini od 8.115 m<sup>2</sup>.

Tijekom provođenja završne kontrole kvalitete Povjerenstvo je u 13 slučajeva utvrdilo da poslovi nisu obavljani kvalitetno te je naloženo ponavljanje poslova na ukupno 320.483 m<sup>2</sup>.

R.br.	Oznaka projekta	Naziv projekta	Županija	Površina projekta m <sup>2</sup>	Tvrtka	Status
1	PR-SMJAS-026-01-18	G.J. Grede Kamare, 5. dio	SM	566.239	ISTRAŽIVAČ	Zaprimljen zahtjev za ZKK
2	PR-LSOTČ-042-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 1. dio	LS	1.071.826	CAPSULA INTERNA	Geodetska izmjera
3	PR-KASAB-002-01-18	Općina Saborsko, G. J. Titra - Javornik	KA	116.300	HEKSOGEN	Završena geodetska izmjera
4	PR-LSPER-041-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Alivojvodići	LS	861.347	FAS	Završena geodetska izmjera
5	PR-LSGOS-050-03-18	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 3. dio	LS	731.077	MAPER	Završena geodetska izmjera
6	PR-LSGOS-049-03-18	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 2. dio	LS	324.515	TETRAZEN	Završena geodetska izmjera
7	PR-LSVRH-051-03-18	Poljoprivredne površine na području Općine Vrhovine	LS	322.249	PIPER	Završena geodetska izmjera
8	PR-LSPJE-038-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Čanak	LS	289.252	TITAN	Završena geodetska izmjera
9	PR-LSVRH-039-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Drage	LS	541.875	ISTRAŽIVAČ	Završena geodetska izmjera
10	PR-LSPJE-040-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac	LS	765.787	HARPIJA	Završena geodetska izmjera
11	PR-LSGOS-048-03-18	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 1. dio	LS	528.041	COR	Završena geodetska izmjera
12	PR-LSOTČ-044-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 3. dio	LS	1.077.427	ZELENI KVADRAT	Završena geodetska izmjera
13	PR-SMSUNJ-054-03-18	Poljoprivredne površine uz naselje Strmen i kanal Sunja	SM	535.927	DOK-ING razminiranje	Završena geodetska izmjera
14	PR-KAJOS-021-01-18	Površine na području Vajin Vrha u općini Josipdol	KA	446.951	HEKSOGEN	Napravljena završna analiza
15	PR-PSPAK-037-02-18	Šumske površine južno od naselja Cicvare u G.J. Sjeverni Psunj - Javorovica	PS	686.431	PIPER	Napravljena završna analiza
16	PR-SMDVO-053-03-18	Poljoprivredne površine u naseljima Ostojići i Gornji Žirovac u Općini Dvor	SM	260.227	COR	Napravljena završna analiza
17	PR-SDVRL-027-07-17	Površine na području Modraša u dinarskom gorju	SD	150.820	HARPIJA	Napravljena završna analiza
<b>UKUPNO</b>				<b>9.276.291</b>		

**Tablica 3.5. Preostalo za završnu kontrolu kvalitete i izdavanje Potvrda o isključenju**

Na ukupno 17 projekata na kojima su odrađeni poslovi razminiranja u 2018. godini, na površini od 9.276.291 m<sup>2</sup> potrebno je u 2018. godini izvršiti završnu kontrolu kvalitete i izdati potvrde o isključenju površina iz minski sumnjivih.

Tijekom 2018. godine zaprimljeno je 17 dojava o pronalascima MES-a i NUS-a od čega se 15 pronalazaka odnosilo na područja koja su bila predmet obavljanja poslova razminiranja i tehničkog izvida, a 1 pronalazak odnosio se na pronalazke van MSP-a, dok je 1 dojava nakon izlaska i provjere na terenu bila lažna (radilo se o hidrantu).


Rb	Datum pronalaska	Mjesto pronalaska		Pronađeno sredstvo			Pronađeno na području / projektu
		Županija	Općina / Grad	Vrsta	Tip	Količina	Razminirano /Isključeno TI / Van MSP-a
1	9.1.2018.	ZD	Stankovci	MES	PMR-2A	1	Isključeno TI
2	18.1.2018.	LS	Otočac	MES	TMA-3	2	R
3	15.4.2018.	LS	Plitvička Jezera	MES	PMR-2A	1	Van MSP-a
4	16.4.2018.	VP	Čačinci	MES	TMA-3	1	R
5	25.4.2018.	ZD	Jasenice	MES	PMA-2	1	R
6	7.5.2018.	KA	Josipdol	MES	TMA-3	1	R
7	10.5.2018.	DN	Konavle	MES	PMR-2A	1	R
8	14.5.2018.	DN	Konavle	MES	PMR-2A	1	R
9	21.5.2018.	ZD	Obrovac				Lažna dojava
10	22.5.2018.	OB	Darda	NUS	RB M75	2	R
11	12.6.2018.	OB	Petlovac	MES	TMA-4	1	R
					PMA-3	1	
12	6.8.2018.	KA	Karlovac	MES	TMA-4	1	R
13	16.8.2018.	OB	Stari Jankovci	MES	PMA-3	1	R
14	18.8.2018.	KA	Lasinja	MES	TMA-4	1	R
15	11.9.2018.	SM	Petrinja	MES	PMA-2	1	R
16	9.10.2018.	OB	Petlovac	MES	TMA-4	2	R
17	5.11.2018.	LS	Plitvička Jezera	MES	PMR-2A	1	R
<b>UKUPNO</b>						<b>20</b>	

Tablica 3.6. Evidencija naknadno pronađenog MES-a i NUS-a

Minski sumnjivo područje aktivnostima protuminskog djelovanja smanjeno je za 56 km<sup>2</sup>, od čega općim i tehničkim izvidom za 7,2 km<sup>2</sup>. Udio realizacije tvrtki (njih 40) na poslovima razminiranja je 48,8 km<sup>2</sup>.

R.br.	Tvrтка	Broj radnih dana	Dani rada pirotehničara	Dani rada strojeva	Dani rada pasa	Udio realizacije tvrtke u odnosu na ukupno realizirano
						%
1.	ALFA RAZMINIRANJE	183	1.625	5	0	1,33
2.	AVATAR RAZMINIRANJE	195	1.301	15	8	1,01
3.	BIOS-F	198	3.052	55	1	2,63
4.	CAPSULA INTERNA	232	2.972	32	173	3,38
5.	COR	249	3.659	75	0	2,71
6.	CREDO	241	1.406	12	7	1,33
7.	DETEKTOR	231	3.876	12	0	1,70
8.	DETONATOR	162	1.297	3	2	1,05
9.	DIZ-EKO	259	2.850	73	317	3,25
10.	DOK-ING	55	0	82	0	0,00
11.	DOK-ING razminiranje	290	7.325	224	132	7,19
12.	EXPLORATOR	228	2.060	19	87	1,97
13.	FAS	222	3.069	26	18	2,89
14.	FAS-PRO	99	0	96	0	0,00
15.	FOSSIO	227	1.853	15	351	1,89
16.	HARPIJA	224	2.873	10	10	2,32
17.	HEKSOGEN	254	3.844	84	600	5,58
18.	ISTRAŽIVAČ	251	6.861	212	1	8,45
19.	ISTRAŽIVAČ BENZ	185	3.333	93	0	3,75
20.	KRIPTON	140	963	9	32	0,49
21.	LOCO	205	1.621	12	0	1,05
22.	MAGNUS	238	2.127	13	2	1,43
23.	MAPER	214	1.485	9	0	1,32
24.	MINA PLUS	250	4.610	70	145	4,21
25.	MINE-EX	170	820	5	12	0,63
26.	MKA*DEMING	13	99	0	0	0,04
27.	ORKAN	226	1.708	20	105	1,55
28.	PIPER	261	3.356	39	189	2,90
29.	PIPER RAZMINIRANJE	203	1.911	27	63	1,80
30.	PITON	232	2.671	66	73	2,65
31.	PROLUMIS	6	42	2	0	0,02
32.	RUMITAL	260	5.193	245	668	5,50
33.	TAURUS RAZMINIRANJE	192	1.312	4	4	0,92
34.	TETRAZEN	225	3.631	47	0	2,56
35.	TITAN	245	5.092	172	253	5,00
36.	TNT 7	213	2.702	20	209	2,30
37.	TORNADO RAZMINIRANJE	267	3.137	125	585	2,95
38.	ZELENI KVADRAT	228	4.187	161	395	5,10
39.	ZIGO	174	3.481	118	292	3,95
40.	ZONA RAZMINIRANJE	165	1.366	29	5	1,20
<b>UKUPNO</b>		<b>332</b>	<b>104.770</b>	<b>2.336</b>	<b>4.739</b>	<b>100,00</b>

**Tablica 3.7. Pregled angažiranja kapaciteta za razminiranje i ostvarena realizacija, po ovlaštenim pravnim osobama**

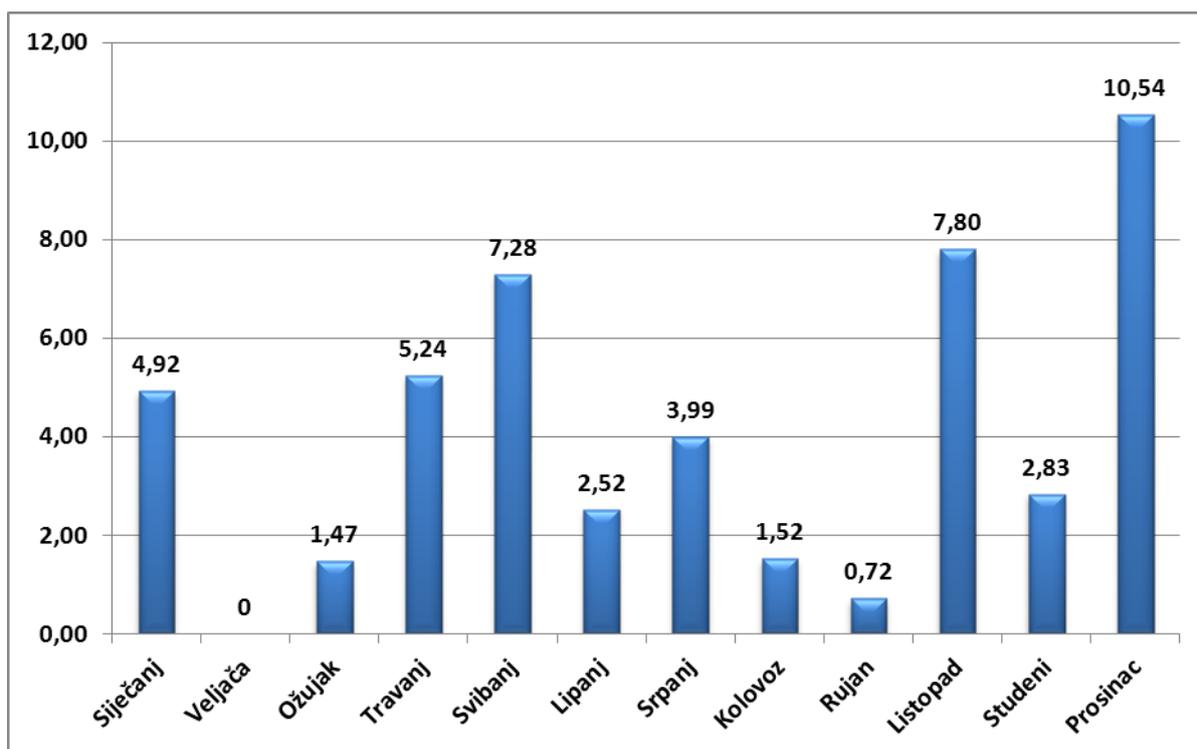

Graf 3.3. Prikaz realizacije poslova razminiranja – izdana potvrda, po mjesecima

Iz prethodnog grafa vidljivo je da je najviše izdanih potvrda o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a, sukladno realizacijama tvrtki, izdano krajem godine, iz razloga što su se u mjesecima koji su prethodili intenzivno obavljali poslovi razminiranja i to poljoprivrednih i šumskih površina, a krajem godine radile završne analize i geodetska izmjera nakon obavljenih poslova.

## OPIS POSLOVA RAZMINIRANJA PREMA ZADANIM CILJEVIMA

### 3.1.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu

Na dan 1. siječnja 2018. godine postojanje kazetnog streljiva je utvrđeno unutar Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Izvršenjem razminiranja s ciljem uklanjanja kazetnog streljiva sa svih površina na kojima je utvrđeno postojanje u cijelosti se izvršava obveza iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika sadržana u Konvenciji o kazetnom streljivu.

R.br.	Oznaka plana	Naziv plana	Tvrтка	Izvor financiranja	Trenutni status	Površina m <sup>2</sup>	Pronađeno kazet. streljiva
1.	PR-LSGOS-005-01-18	Ukupni MSP zagađenim kazetnim streljivom u gradu Gospiću	HARPIJA	DPR	Završen projekt	238.269	233
2.	PR-LSPER-006-01-18	Područje zagađeno kazetnim streljivom u naseljima Studenci i Glibodol	ISTRAŽIVAČ	DPR	Završen projekt	280.024	187
3.	PR-ZDPOS-030-02-18	Područje naselja Ždrilo u općini Posedarje	ZELENI KVADRAT	DP/OKF Š	Završen projekt	42.339	11
4.	PR-LSGOS-033-07-17	Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić	TITAN	„Zagreb – za život bez mina“	Završen projekt	27.663	4
5.	PR-SMPET-003-01-18	Površina u naselju Gornje Mokrice na području grada Petrinje	ISTRAŽIVAČ	DPR	Završen projekt	136.276	130
6.	PR-ŠKŠIB-001-01-18	Površine onečišćene kazetnim streljivom na području Šibensko-kninske županije	ZELENI KVADRAT	DPR	Završen projekt	39.140	6
<b>UKUPNO:</b>						<b>763.711</b>	<b>571</b>

Tablica 3.8. Realizacija na projektima –čišćenje i uništavanje kazetnog streljiva

### 3.1.1.2. Izvršenje posljednjih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema županije

Tijekom proteklog trogodišnjeg razdoblja intenzivno se razminiralo područje Brodsko-posavske županije s ciljem rješavanja u potpunosti minske zagađenosti. U svibnju 2018. godine (24.05. izdane potvrde / certifikati o razminiranosti) završeni su posljednji poslovi razminiranjem 0,2 km<sup>2</sup> na području Jezera, Konjske Glave i Čardaka u Općini Okučani.

Svečana konferencija povodom proglašenja Brodsko-posavske županije županijom bez mina, održala se 11. lipnja 2018. godine u Slavonskom Brodu.

### 3.1.1.3. Cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske

Jedna od značajnih planiranih zadaća predviđenih za 2018. godinu, zasigurno je cjelovito rješavanje minskog problema poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U 2018. godini nastavljeno je, te i završeno razminiranje površina ugovorenih u 2016. godini (do kraja svibnja 2018.), a na temelju natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) za dodjelu potpore za «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (nadalje u tekstu: APPRRR) raspisala 4. svibnja 2016. godine.

Ugovoreno je svih 17 projekata u 7 županija površine 25.062.140 m<sup>2</sup>. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 207.179.774,40 Kn sa PDV-om.

Na dan 31. prosinca 2017. godine odrađeno je 23.309.301 m<sup>2</sup>, odnosno 93,01% ugovorene površine. U 2018. godini trebali su se završiti ugovoreni poslovi na površini od 1.752.839 m<sup>2</sup> (neke površine su umanjene jer se u tijeku radova naišlo na već obrađene poljoprivredne površine), što je i učinjeno do 31.05.2018. godine.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 5.2.2. RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA									
II. FAZA									
Rb	Županija	Površina m <sup>2</sup>	Ugovorena cijena s PDV- om	Realizirano na dan 31.12.2017.	Realizirano na dan 31.05.2018.	Postotak završenih radova (%)	Pronađen MES i NUS		
							PP	PO	NUS
1	Ličko-senjska	11.253.465	88.153.232,29	10.080.775	11.154.195	99,12	529	10	65
2	Osječko- baranjska	912.748	7.153.662,45	912.748	912.748	100,00	20	0	36
3	Požeško- slavonska	3.706.367	31.735.767,44	3.148.314	3.709.270	100,08	12	0	1
4	Splitsko- dalmatinska	1.003.607	9.697.352,64	1.003.607	1.003.607	100,00	14	0	1
5	Sisačko- moslavačka	6.801.122	56.212.882,90	6.786.957	6.786.957	99,79	201	23	14
6	Šibensko- kninska	669.797	6.915.654,03	661.866	661.866	98,82	8	0	2
7	Zadarska	715.034	7.311.222,65	715.034	715.034	100,00	8	0	49
<b>Ukupno</b>		<b>25.062.140</b>	<b>207.179.774,40</b>	<b>23.309.301</b>	<b>24.943.677</b>	<b>99,53</b>	<b>792</b>	<b>33</b>	<b>168</b>

Tablica 3.9. Realizacija na projektima Mjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednih površina – Faza II

Također, kroz III. fazu Tipa operacije 5.2.2. razminirat će se preostalo cjelovito poljoprivredno zemljište Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije cca 10 km<sup>2</sup>.

Natječaj za III. fazu razminiranja poljoprivrednog zemljišta objavljen je 23. ožujka 2018. godine i trajao je do 13. travnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom javnom natječaju iznosi 104 mil. kuna (udio javne potpore u prihvatljivim troškovima je 100%). Prihvatljivi korisnici su JLS na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina (a to su Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka županija) kojima smo na temelju njihovog zahtjeva, a sukladno natječaju, pružili tehničku pomoć u pripremi potpune dokumentacije za prijavu na isti.

Sisačko-moslavačka županija je u svibnju (za 4 idejna plana) i lipnju (za 2 idejna plana) raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima koje je izradio HCR, dok je Ličko-senjska županija u lipnju raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima koje je izradio HCR (svih 13).

Do 31. prosinca 2018. godine radovi su ugovoreni za svih 19 projekata (13 u LSŽ, 6 u SMŽ) na ukupnoj površini od 10.879.333 m<sup>2</sup> (iz EPFRR 9.897.531 m<sup>2</sup>). Ukupna

vrijednost ugovorenih radova iznosi 112.427.989,15 kuna (iz EPFRR 102.136.990,72 kuna).

Radovi su započeli i u tijeku su na 16 projekata (od čega su na 16 projekata i završeni – 4 u SMŽ i 12 u LSŽ), odnosno do sada je odrađeno 9.918.438 m<sup>2</sup>, što iznosi 91,17% ugovorene površine.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ MJERA 5.2.2. RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA										
III. FAZA										
Rb	Županija	Površina m <sup>2</sup>	Ugovorena cijena s PDV- om	Površina EPFRR m <sup>2</sup>	Ugovorena cijena s PDV- om EPFRR	Realizirano na dan 31.12.2018.	Postotak završenih radova (%)	Pronađen MES i NUS		
								PP	PO	NUS
1	Ličko-senjska	8.438.806	88.067.126,68	7.663.787	79.814.243,24	8.071.887	95,65	253	4	400
2	Sisačko- moslavačka	2.440.527	18.533.433,09	2.233.744	22.322.747,48	1.846.551	75,66	30	4	408
<b>Ukupno</b>		<b>10.879.333</b>	<b>106.600.559,77</b>	<b>9.897.531</b>	<b>102.136.990,72</b>	<b>9.918.438</b>	<b>91,17</b>	<b>283</b>	<b>8</b>	<b>808</b>

Tablica 3.10. Realizacija na projektima Mjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednih površina – Faza III

S obzirom da razminiranje ugovorenih poljoprivrednih površina nije završeno do kraja 2018. godine očekujemo da će isti biti u potpunosti završeni u prvoj polovici 2019. godine, čijim izvršenjem će se u cijelosti ukloniti minska opasnost s poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske.

#### 3.1.1.4. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Tijekom 2018. godine nastavilo se s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje će omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Na području Karlovačke županije razminirala se gospodarska jedinica Makovnik u Općini Plaški (II. Kvartal), u Ličko-senjskoj gospodarske jedinice Lisac-Staparuša i Božin Vrh u Gradu Otočcu (II. i III. Kvartal), u Požeško-slavonskoj županiji gospodarska jedinica Sjeverni Psunj-Javorovica (I. i II kvartal), a u Sisačko-moslavačkoj županiji gospodarske jedinice Grede-Kamare i Rajičko Brdo (I. Kvartal). Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a.

Iz istog izvora – OKFŠ, financiralo se razminiranje šumskog zemljišta u Gradu Skradinu, gospodarska jedinica Guduća i u Općini Pakoštane gospodarska jedinica Vrana. Osim gospodarske vrijednosti razminiranje ovog šumskog zemljišta je bitno za provedbu učinkovite protupožarne zaštite.

Sredstvima iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje financira se razminiranje izrazito miniranog šumskog zemljišta unutar gospodarske jedinice Kotar-Stari Gaj u Gradu Petrinja.

### **3.1.1.5. Započinjanje s poslovima razminiranja na 25,3 km<sup>2</sup> zaštićenih i Natura 2000 područja Osječko-baranjske županije**

Tijekom 2018. godine započelo se s petogodišnjom realizacijom poslova s ciljem razminiranja šumskog zemljišta veličine 25,3 km<sup>2</sup>, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Realizacijom poslova omogućit će se revitalizacija šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom, a koja su zapuštena i degradirana zbog posljedica ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Razminiranje će se izvršiti na području Specijalnog zoološkog rezervata Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura Drava u Gradu Osijeku i općinama Bilje i Darda.

Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pokrenuti su postupci javne nabave s ciljem ustupanja poslova razminiranja na 5 cjelina koje predstavljaju ukupno predmetno minski zagađeno, zaštićeno, šumsko područje. Natječajna dokumentacija, kao i provedba poslova razminiranja, odnosno kontrola kvalitete nad poslovima, razminiranja u cijelosti će poštivati zahtjeve koje je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a vezano za zaštitu okoliša.

Dana 21. svibnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Hrvatski centar za razminiranje objavio je poziv na nadmetanje za nabavu usluga razminiranja minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji (5 grupa/cjelina nabave) ukupne površine 25.343.683 m<sup>2</sup>. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 202.903.074,88 kn bez PDV-a, a nabava je podijeljena u grupe/projektne cjeline kako slijedi:

- 1. cjelina – Naturavita – JU Park prirode Kopački rit
- 2. cjelina – Naturavita – desna obala Drave
- 3. cjelina – Naturavita – Dravica I
- 4. cjelina – Naturavita – Bezdan - Topolik
- 5. cjelina – Naturavita – Veliko polje – Biljski rit.

Dana 2. srpnja, u sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje održano je javno otvaranje pristiglih ponuda, a odluke o odabiru za svih 5 grupa donesene su 25. srpnja 2018. Ukupna vrijednosti odabranih ponuda iznosi 200.215.783,50 kn bez PDV-a, odnosno 250.269.729,37 kuna s PDV-om.

Dana 14. kolovoza, ministar zaštite okoliša i energetike donio je Odluku o financiranju projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“. Odlukom se Hrvatskim šumama d.o.o. odobrava financiranje navedenog projekta, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalnih 85%, odnosno 314.139.354,67 kuna.

Dana 14. kolovoza, s tvrtkom Heksogen d.o.o. iz Dubrovnika potpisan je ugovor za izvođenje poslova razminiranja na 1. projektnoj cjelini, a tvrtka je 17. kolovoza uvedena u posao te su započeli radovi. Tijekom rujna radovi su privremeno obustavljeni, zbog poštivanja uvjeta zaštite prirode, odnosno zbog rike jelena.

Dana 6. rujna, potpisani su ugovori za izvođenje poslova razminiranja i za ostale 4 projektne cjeline:

- za 2. cjelinu sa Zajednicom ponuditelja COR d.o.o., Požega i TETRAZEN d.o.o. Ozalj,
- za 3. cjelinu sa tvrtkom ISTRAŽIVAČ d.o.o. Nuštar,
- za 4. cjelinu sa tvrtkom DOK-ING razminiranje d.o.o. Zagreb,
- za 5. cjelinu sa tvrtkom Rumital d.o.o. Zagreb.

Nastavno na Odluku o financiranju koja je donesena u kolovozu, 21. rujna 2018. godine, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt NATURAVITA.

Svi izvođači su uvedeni u posao i razminiranje je trenutno u tijeku.

RB	Naziv idejnog plana	Oznaka idejnog plana	Površina (m <sup>2</sup> )	Ugovorena cijena s PDV-om	Realizirano na dan 31.12.2018.	Postotak završenih radova (%)	Pronađen MES i NUS			Napomena
							PP	PO	NUS	
1.	Naturavita - "JU Park prirode Kopački rit"	PR-OBILJ-051-07-16	5.975.875	74.175.548,44	5.568.244	93,2	37	0	0	Radovi u tijeku
2.	Naturavita - desna obala rijeke Drave	PR-OBOSI-050-06-16	2.651.371	23.961.765,41	1.318.033	49,7	1	0	0	Radovi u tijeku
3.	Naturavita - "Dravica I"	PR-OBILJ-047-06-16	6.532.301	57.974.171,38	3.232.140	49,5	0	2	69	Radovi u tijeku
4.	Naturavita - "Bezdan - Topolik"	PR-OB DAR-049-06-16	5.299.511	46.105.745,70	1.631.948	30,8	0	0	0	Radovi u tijeku
5.	Naturavita - "Veliko polje - Biljski rit"	PR-OB DAR-048-06-18	4.884.625	48.052.498,44	3.079.783	63,1	442	767	6	Radovi u tijeku
UKUPNO			25.343.683	250.269.729,37	14.830.148	58,5	480	769	75	

Tablica 3.11. Realizacija u tijeku na projektima Naturavita

### 3.1.2. Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida

Usporedo s poslovima razminiranja MSP-a koji su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje su u 2018. godini vršili ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u.

Na području devet županija Hrvatski centar za razminiranje obavljao je i poslove tehničkog izvida, općeg izvida i dopunskog općeg izvida unutar poligona kategoriziranih za pretraživanje s ciljem dodatne provjere podataka.

U izvještajnom razdoblju, MSP je provedbom tehničkog izvida, općeg izvida i dopunskog općeg izvida, smanjen za 8.606.391 m<sup>2</sup>.

Tijekom izvršenja poslova općeg izvida osim isključivanja površina iz minski sumnjivih temeljem novih saznanja o minskog zagađenosti dio površina je uključen u minski sumnjive, veličine 1.402.816 m<sup>2</sup>,

Izvršenje ovih poslova rezultiralo je smanjenjem MSP u veličini od 7,2 km<sup>2</sup>.

Sukladno navedenom, Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na opći i tehnički izvid je ostvaren sa 43,2%.

Red br.	Županija	Planirani poslovi TI, OI i DOI u 2018. (m <sup>2</sup> )	ISKLUČENJE poslovima TI i DOI (m <sup>2</sup> )	UKLJUČENJE poslovima OI i DOI (m <sup>2</sup> )	Ukupno smanjenje poslovima TI, OI i DOI (m <sup>2</sup> )	Ostvarenje %
	Brodsko-posavska	0	0	232.977	-232.977	0,0
1.	Karlovačka	800.030	484.228	0	0	60,5
2.	Ličko-senjska	220.808	0	417.661	-417.661	-189,2
3.	Osječko-baranjska	6.852.312	1.127.212	93	1.127.119	16,4
4.	Požeško-slavonska	2.825.278	1.643.392	530.039	1.113.353	39,4
5.	Splitsko-dalmatinska	448	448	0	448	100,0
6.	Sisačko-moslavačka	97.240	17.973	105.941	-87.968	-90,5
7.	Šibensko-kninska	1.427.823	1.476.307	40.318	1.435.989	100,6
8.	Zadarska	4.437.973	3.856.831	75.787	3.781.044	85,2
<b>UKUPNO:</b>		<b>16.661.912</b>	<b>8.606.391</b>	<b>1.402.816</b>	<b>7.203.575</b>	<b>43,2</b>

Tablica 3.12. Ukupno planirano i ostvareno smanjenje MSP-a općim i tehničkim izvidom po županijama


Planirani rezultati tehničkog izvida nisu ostvareni zbog sljedećih razloga:

- Plan za 2018. godinu temeljen je na kapacitetima 60 pirotehničara (Mungos razminiranje – 50 pirotehničara i HCR – 10 pirotehničara). Nakon integracije Mungos razminiranja u HCR dolazi do odlaska 29 pirotehničara koji su zbrinuti sukladno Zakonu o radu i odluci Vlade RH.
- Tijekom 2018. godine duži period nismo nakon provođenja javne nabave dobivali ponude za strojnu pripremu terena na projektima tehničkog izvida iz razloga što su bili zauzeti poslovima u tvrtkama vlasnika.

### 3.1.3. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid

Hrvatski centar za razminiranje izvršava analizu podataka vezanih uz strukturu MSP-a korištenjem podataka o kategorizaciji zemljišnog pokrova tvrtke Hrvatske šume d.o.o., Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agencije za zaštitu okoliša i Državne geodetske uprave.

Temeljem provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2018. godine, utvrđeno je 4,0% MSP-a Republike Hrvatske kao poljoprivredne površine, 95,7% MSP-a kao šumske površine te 0,3% MSP-a kao ostale površine (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenari, obale i dr.).

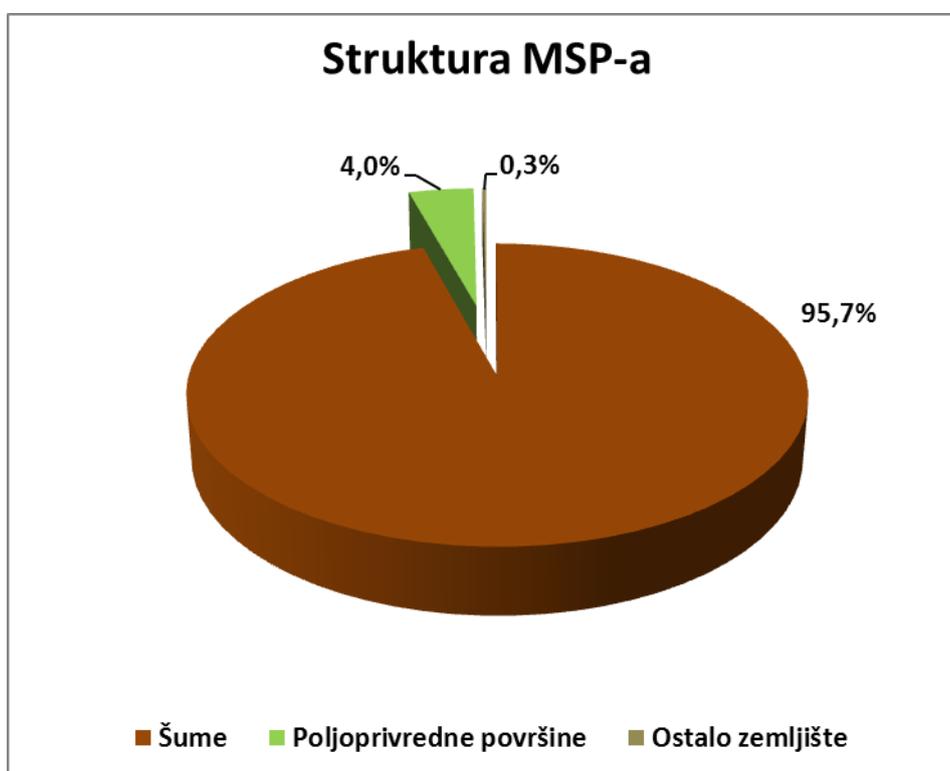

Graf 3.4. Struktura MSP-a Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2018. godine

### 3.2. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima

Usporedo s provedbom općeg i tehničkog izvida i poslova razminiranja u 2018. godini, jedna od težišnih aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje bila je provedba i kontrola obilježnosti i prema potrebi, dodatno obilježavanje minski sumnjivog

područja i područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine ili površine zagađene isključivo NUS-om.

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od temeljnih elemenata informacijskog sustava koji je dostupan svim građanima Republike Hrvatske i gostima koji dolaze u našu zemlju putem Interneta kroz MISportal na kojem se stanje miniranosti, zagađenosti isključivo NUS-om i obilježenosti MSP-a, tjedno ažurira. Zemljovidi miniranosti i zagađenosti isključivo NUS-om s podacima o postavljenim oznakama upozorenja su se i u 2018. godini dostavljali tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama na zahtjev.

Na dan 1. siječnja 2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.544 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava te se prostirao unutar 59 gradova i općina u 9 županija.

Dana 31. prosinca 2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava i prostirao se unutar 55 gradova i općina u 8 županija.

### **3.3. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova**

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, kontinuirano je tijekom 2018. godine provodio informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Ukupno je planirano 75 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2018. godini.

#### **3.3.1. Edukacija o opasnostima od mina**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kroz 95 aktivnosti informirano i educirano je 20.977 osoba o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Informiranje i edukacije su održane u 15 županija i Gradu Zagrebu, u 62 grada/općine (građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, HEP-a, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volonteri, i drugi).

Edukacije su najvećim dijelom pratile idejne planove razminiranja na području minski zagađenih županija u skladu s Godišnjim planom razminiranja za 2018. godinu.

Sva informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a su popraćena javnim i lokalnim medijima, a Hrvatski centar za razminiranje je na svom web portalu redovito i ažurno objavljivao informacije o provedenim aktivnostima.

Rb.	Edukacija o opasnostima od mina	Planirane edukacije	Izvršene edukacije	Realizirano u 2018. godini %
1.	Godišnji plan protuminskog djelovanja	35	27	77,1
2.	Na poziv	25	46	184,0
3.	Prema ciljanim skupinama	15	22	146,7
<b>UKUPNO</b>		75	95	126,7

Tablica broj 3.13. Izvršenje edukacija o opasnosti od mina u 2018. godini

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova RH „Manje oružja, manje tragedije“ (83 edukacije na kojima je sudjelovalo 18.352 osobe).

Najveći broj posjetitelja je bio u sklopu aktivnosti: Sajma lova i ribolova SALORI u Osijeku, Danima lova i ribolova u Zagrebu, Danima otvorenih vrata Policije u Požeško-slavonskoj županiji, Sportskim igrama mladih „Zajedno možemo više – u akciji s policijom“, Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, te pri obilježavanju „4. travnja“ - Međunarodnog dana svjesnosti opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju u Osijeku.


Provedene su i edukacije ciljanih skupina: djece u minskom okruženju, lovaca, planinara, djelatnika sigurnosti HŠ, volontera kampa Podum, djelatnika Hrvatske turističke zajednice te edukaciji branitelja 100%-tnih invalida Domovinskog rata i branitelja JSP „Osa“ u Varaždinskim Toplicama.

Najveći broj aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u 2018. godini HCR je ostvario u suradnji sa: MUPRH, HCK i Udrugom Hrvatska pomaže.

### 3.3.2. Žrtve mina


**U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije bilo minskih incidenata i nesreća.**

Od 01.01.1996. godine do 31.12.2018. godine dogodilo se 423 minska incidenata i nesreća u kojima je ukupno stradalo 595 osoba. Smrtno je stradalo 203 osobe, teške tjelesne ozljede zadobilo je 271 osoba dok ih je 120 zadobilo lake tjelesne ozljede.

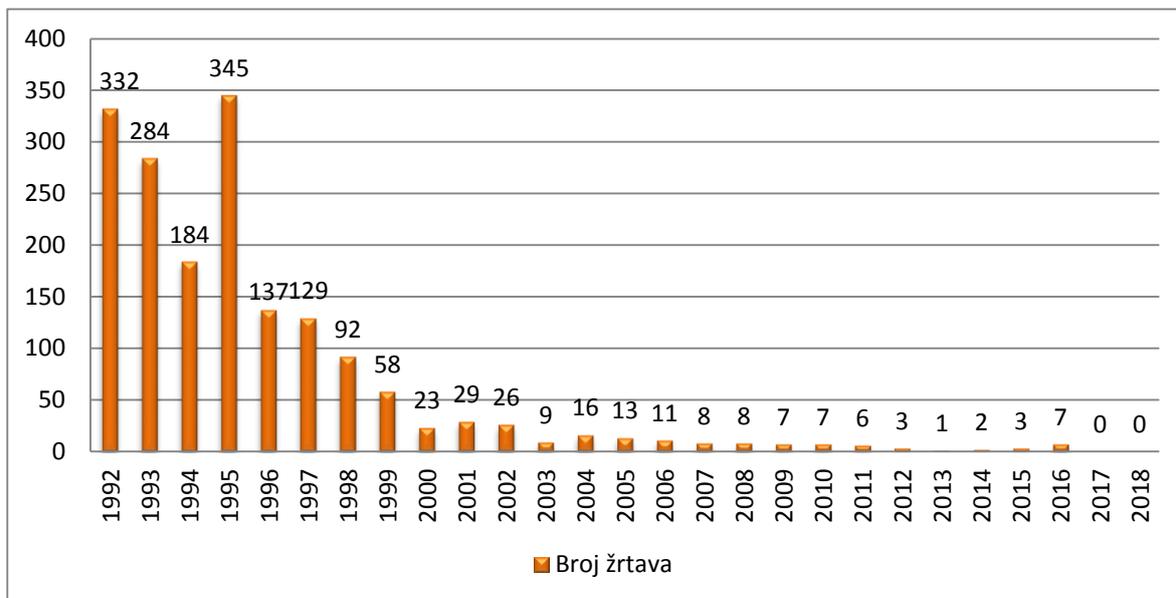

Graf broj 3.5. Broj žrtava mina u razdoblju 1991.-2018. godina

U razdoblju od 1991. do kraja 2018. godine u 1.372 minska incidenta i nesreća stradalo je 2.006 osoba, od čega 523 osobe smrtno. Promjene u odnosu na podatke iz Plana za 2018. godinu dogodile su se u 1992., 1993. i 1995. godini, za incidente i žrtve za koje do sada nismo imali podatke.

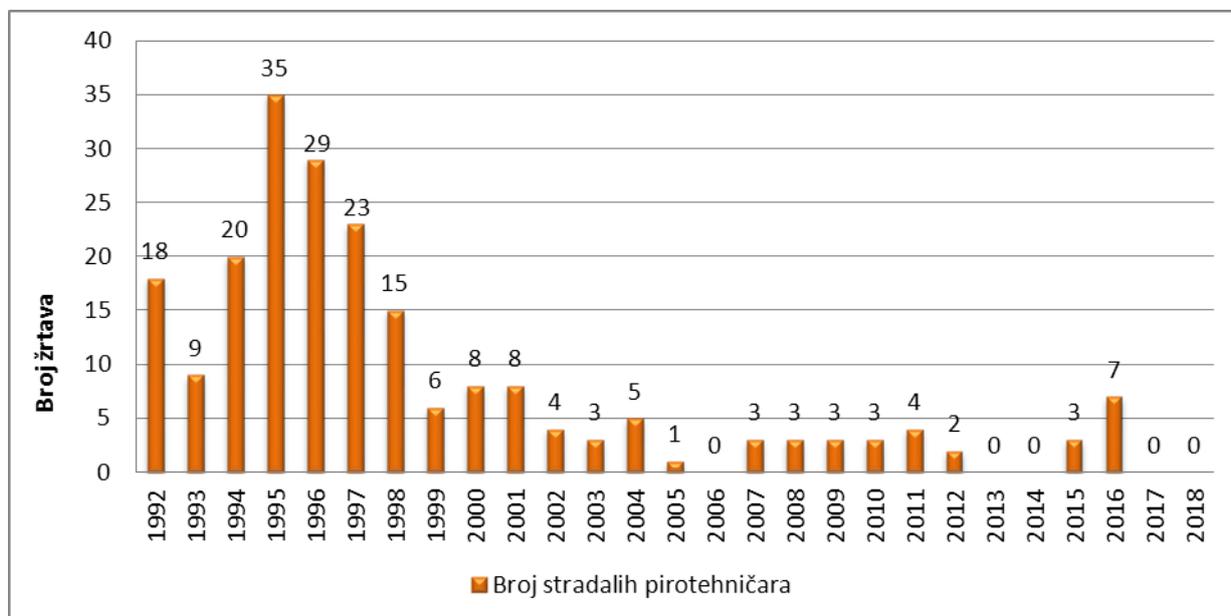

Graf 3.6. Broj stradalih pirotehničara po godinama

### 3.4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

Hrvatski centar za razminiranje i ostali dionici sustava protuminskog djelovanja su, s ciljem promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici, provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja:

- 17. siječnja 2018. godine, u sjedištu HCR-a održan je sastanak sa čelnicima ITF - Enhancing Human Security organizacije.
- 29. siječnja 2018. godine, predsjednica UV HCR-a i ravnatelj HCR-a zajedno s predstavnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, Nj.E. Gordanom Bakotom i opunomoćenim ministrom Stjepanom Glasom, sastali su se s predstavnicima Centra za razminiranje Republike Srbije. Na sastanku su razmijenjena dosadašnja iskustva dviju zemalja iz područja protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja te je iskazana potreba i spremnost za intenziviranjem zajedničke suradnje, prvenstveno realizacijom potencijalnih projekata prekogranične suradnje iz fondova Europske unije.
- 30. siječnja 2018. godine, u sjedištu HCR-a organiziran je posjet ukrajinske delegacije koju su, osim zastupnika različitih političkih opcija u parlamentu, činili i predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva privremeno okupiranih područja i prognanika, Ministarstva vanjskih poslova, Agencije za krizne situacije, uz pratnju predstavnika veleposlanstava Velike Britanije i SAD-a u Kijevu, Ženevskoga međunarodnog centra za humanitarno razminiranje te Misije OESS-a u Kijevu. Prilikom posjeta gostima je prezentiran hrvatski sustav protuminskog djelovanja uz razmatranje buduće međusobne suradnje.
- Od 13. do 16. veljače 2018., pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje predstavljao je Hrvatski centar za razminiranje (HCR) na 21. sastanku ravnatelja nacionalnih protuminskih sustava i savjetnika UN (NDM21) koji se održao u Ženevi. U sklopu sastanka održani su bilateralni kontakti s predstavnicima Turskog centra za razminiranje (TURMAC) i UNDP-a Istanbul, te s ravnateljem Izraelskog središta za protuminsko djelovanje (INMAA). Također, gđu Sheilu N. Mweembu iz Jedinice za podršku provedbe Konvencije o kazetnom streljivu (ISU CCM) izviještena je o nastavku dobrovoljnih kontribucija radu ISU-a od strane predstavnika RH i u 2018.
- Od 28. veljače do 1. ožujka 2018. godine, izaslanstvo HCR-a u sastavu Predsjednica Upravnog vijeća HCR-a i ravnatelj HCR-a, boravili su u Republici Irak, Bagdadu, na poziv Direktorata za razminiranje te Ministarstva zdravlja i zaštite okoliša Iraka. Na radnom sastanku hrvatsko je izaslanstvo razmijenilo iskustva u protuminskom djelovanju odnosno humanitarnom razminiranju s domaćinom,

direktorom g. Saheb Ahmedom i njegovim suradnicima. Drugi dan posjeta održan je susret s programskim menadžerom UNMAS-a u Iraku g. Ludhammerom.

- 14. ožujka, 2018. godine potpisan je ugovor o doniranju sredstava za razminiranje minski sumnjivih područja između Američke gospodarske komore u Hrvatskoj i HCR-a. Ukupno sakupljena sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna namijenjena su financiranju poslova razminiranja minski sumnjivog područja Zadarske županije.
- 6. travnja, uspješno su predani Izvještajni upitnici o implementaciji aktivnosti protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, poglavito u kontekstu obveza preuzetih međunarodnim konvencijama, prema „Mine Action Review“ publikaciji, neovisnom istraživačkom projektu financiranom od strane organizacije Norveške narodne pomoći (NPA) koji ima za cilj pružanje transparentnih i provjerenih informacija međunarodnoj protuminskoj zajednici.
- Od 9. do 12. travnja, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Slanom, održao se 15. Međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2018“ u organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje, HCR-Centra za testiranje, razvoj i obuku, d.o.o. i Ureda za razminiranje. Na ovogodišnjem Simpoziju sudjelovalo je oko 170 sudionika iz 31 zemlje svijeta (Kolumbije, Saudijske Arabije, Iraka, SAD-a, Izraela, Belgije, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Španjolske, Švedske, Azerbajdžana, Malte, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Ruske Federacije i drugih).
- 10. travnja, u sklopu 15. Međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2018“, održan je bilateralni sastanak između predstavnika Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na kojem se, uz prisustvo g. Juan Carlos Ruana, direktora Jedinice za podršku provedbe Ottawske konvencije iz Ženeve te druge ugledne goste iz međunarodne zajednice, raspravljalo o dosadašnjoj suradnji u protuminskom djelovanju te perspektivi budućih zajedničkih aktivnosti.
- 10. travnja, u sklopu 15. Međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2018“, održan je sastanak SEEMACC-a (Koordinacijskog vijeća centara za protuminsko djelovanje Jugoistočne Europe) na kojem su sudjelovali i predstavnici HCR-a.
- 23. travnja, uspješno su izvršene obveze prema međunarodnim konvencijama izradom Godišnjih nacionalnih izvješća RH za 2017. godinu prema Ottawskoj Konvenciji i Konvenciji o kazetnom streljivu koja također sadrže objedinjene podatke MORH-a i MUP-a RH za 2017. godinu.
- 21. svibnja, Međunarodna zaklada za unapređenje ljudske sigurnosti (ITF Enhancing Human Security - ITF) prigodnom izložbom obilježila je 20. godina aktivnosti u Hrvatskoj. Otvaranju izložbe, osim predstavnika diplomatskog zbora akreditiranih u RH, nazočio je i ravnatelj HCR-a, te se nazočnima obratio s prigodnim riječima zahvale na dosadašnjoj suradnji te, obzirom na još uvijek prisutnu minsku opasnost u Hrvatskoj i regiji, pozvao donatore da i dalje sudjeluju u okvirima protuminskog djelovanja.

- 22. svibnja, u Zagrebu je održan prijam povodom proslave 100. godišnjice Azerbajdžanske Demokratske Republike, a s obzirom na potpisan Memorandum o suradnji u protuminskom djelovanju te višegodišnjem partnerstvu između HCR-a i ANAME (Azerbajdžanska nacionalna agencija za protuminsko djelovanje), prijemu je prisustvovao i pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje.
- 28. svibnja, Hrvatski centar za razminiranje posjetio je Giuseppe DiCaro sa suradnicama, Predstavnik Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj. Tema sastanka bila je razmjena informacija potrebnih zbog izbjegličke krize te ilegalnih migracija, odnosno mjera predostrožnosti koje se provode zbog zaštite takvih osoba u kontekstu upozorenja na minsku opasnost.
- Od 30. - 31. svibnja, delegacija HCR-a i HCR-CTRO-a posjetila je Republiku Kolumbiju. Delegacija u sastavu predsjednica UV HCR-a, ravnatelj HCR-a te savjetnik iz Centru za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., održala je 30. svibnja 2018. godine sastanak sa senatorom Uribe Velezom i predstavnicima DAICMA-e. 31. svibnja 2018. godine delegacija je održala sastanke s potpredsjednikom Oscarom Naranjom, čiji je ured nadležan za razminiranje na području Republike Kolumbije te direktno upravlja DAICMA-om. Istoga dana, održan je sastanak s zamjenicom ministra za multilateralne poslove Adrianom Mendozom La Cancilleria (Ministarstvo vanjskih poslova Republike Kolumbije), a također na njezin zahtjev, predstavnici RH sastali su se i s dozapovjednikom DIRAN-a, Uprave za borbu protiv narkotika.
- 8. lipnja, ravnatelj HCR-a i pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje sudjelovali su na Anti-Personnel Mine Ban Convention Intersessional meeting koji se održava u Ženevi. Ondje je prezentiran drugi zahtjev Republike Hrvatske za produženjem roka završetka rješavanja minskog problema u Republici Hrvatskoj sukladno članku 5. Ottawske konvencije.
- 21. lipnja, održan je radni sastanak u veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu na temu prethodne suradnje i razmjene podataka u vezi MANPADS-a (prijenosni sustavi protuzračne obrane). Sastanku su nazočili predstavnici Američkog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj i službenici State Departmenta iz Washingtona, predstavnici MUP-a, MORH-a te ispred HCR-a - ravnatelj.
- 19. lipnja, u organizaciji „Hrvatska bez mina“- Zaklade za humanitarno razminiranje Hrvatske, PU Istarske i Hrvatskog centra za razminiranje, u odmaralištu Gradskog Crvenog križa Grada Zagreba, u Novom Vinodolskom održana je edukacija o opasnostima od mina za djecu iz Sirije i Hrvatske, Istarske i Primorsko-goranske županije. Ukratko im je prikazan minski problem u Hrvatskoj te je djeci ukazano na pravila ponašanja prilikom nailaska na minski sumnjivi prostor ili na nepoznate predmete u prirodi ili na nekim drugim mjestima.
- 3. srpnja, u sklopu dvadesete obljetnice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, Hrvatsko-ukrajinsko društvo (prijateljstva) organiziralo je prigodno obilježavanje

kojem su poradi predstavljanja minskog problema u Republici Hrvatskoj tijekom mirne reintegracije i danas prisustvovali predsjednica Upravnog vijeća i ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje.

- 4. srpnja, u Sarajevu je predstavljen način provođenja projekta Ministarstva hrvatskih branitelja i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže „Branitelji za branitelje 100% HRVI“. Tom prigodom, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje g. Zdravko Modrušan prezentirao je rad i rezultate Centra u posljednjih dvadeset godina te upoznao nazočne s trenutnim stanjem minskog problema u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na plan rješavanje istog u sljedećih sedam godina sukladno Ottawskoj konvenciji. Također, predsjednica Upravnog vijeća HCR-a, prezentirala je djelovanje Udruge „Hrvatska pomaže“ u protekle četiri godine postojanja.
- 11. srpnja, održana je svečanost predaje potvrde o isključenju iz minski sumnjivog prostora područja „Površine uz rijeku Tounjčicu“ u Općini Tounj, na projektu gdje su vršeni poslovi financirani donacijom Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AMCHAM).
- 18. srpnja, u Brčkom (BIH) je održan regionalni sastanak centara za razminiranje. Nazočni su bili predsjednica Upravnog vijeća HCR-a, pomoćnik Ministra unutarnjih poslova RH dr.sc. Damir Trut, ravnatelj HCR-a, direktor Centra za uklanjanje mina Srbija g. Jovica Simonović, g. Milovan Joksimović, šef Odsjeka za neeksplozivna i ubojna sredstva MPU-a Crne Gore, direktor BHMACH-a g. Saša Obradović, g. Mladen Mrkaja predstavnik Komisije za deminiranje Bosne i Hercegovine te direktorica NVO Posavina bez mina gđa. Svjetlana Pavlović. Osnovna tema sastanka bila je suradnja svih sudionika na uklanjanju mina uz granična područja uz mogućnost realizacije istoga sufinanciranjem iz EU izvora.
- 29. kolovoza, Hrvatski centar za razminiranje posjetili su boj. Per-Henrik Åberg i civ. Per Sundling iz Centra za razminiranje i uništavanje eksplozivnih sredstava (EOD) koji djeluje u sklopu Oružanih snaga Kraljevine Švedske (SWEDEC). Tom prigodom, predstavljen je integrirani Minsko informacijski sustav (EOD IS) prilagođen NATO standardima, koji su razvile Oružane snage Kraljevine Švedske, a koji temeljem potpisanog Sporazuma partnerski koristi već petnaest EU/NATO zemalja. Hrvatski centar za razminiranje, kao nadležno tijelo za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj, službeno je pozvan pristupanju Minsko informacijskom sustavu (EOD IS) te aktivnom sudjelovanju u svim njegovim radnim tijelima, čijem djelovanju, poradi obuhvatnog iskustva, HCR može znatno pridonijeti.
- 10. rujna, Hrvatski centar za razminiranje posjetio je veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj N.J.E. W. Robert Kohorst, savjetnica za gospodarstvo Nicole Warin i voditelj trgovinskog ureda Damjan Benčić. U ime HCR-a visoke su predstavnike ugostili predsjednica UV HCR-a, ravnatelj HCR-a, te pomoćnici ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje i operativne poslove. Tijekom sastanka razgovaralo se o postojećim projektima financiranim od strane

američkog State Departmenta, pri čemu je, uz poslove razminiranja, važan naglasak stavljen i na kontrolu te upravljanje skladištima streljiva. Istodobno, predstavnici HCR-a, upoznali su Veleposlanika Kohorsta sa širokim rasponom aktivnosti koje protuminski sustav RH može ponuditi u pogledu razvojne suradnje i humanitarne pomoći, s posebnim naglaskom na edukativne aktivnosti te najvišu razinu stručnosti djelatnika u razminiranju.

- 12. rujna, Hrvatski centar za razminiranje posjetila je delegacija Glavnog zapovjedništva EUFOR-a BIH. Navedenu delegaciju u sastavu Albert Proszowski, zapovjednik protuminske jedinice EUFOR-a, Erwin Wirnsberger, zapovjednik mreže za koordinaciju informacija o minama (MICC) te Milad Čerimagić, informacijski savjetnik (MICC) pozdravili su uvodno ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje, nakon čega je prezentaciju HCR-a i protuminskog sustava RH održao pomoćnik ravnatelja za operativne poslove, a prezentaciju edukacije o opasnostima od mina, načelnik odjela za planiranje i edukaciju. Posjet i rasprava o mogućoj suradnji i pomoći koju HCR može ponuditi EUFOR-u BIH nastavljeni su posjetom radilištu razminiranja u Kotar šumi, gdje su članovi delegacije dobili izravan uvid u aktivnosti koje HCR uspješno i svakodnevno provodi na terenu.
- 19. rujna, djelatnici HCR-a (3) prisustvovali su 2. međunarodnoj konferenciji "Održivi razvoj danas" te prezentirali protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj, rad HCR-a u proteklih 20 godina, s naglaskom na minsku situaciju i rješavanje minskog problema u Istočnoj Slavoniji. Navedena trodnevna konferencija u organizaciji Instituta za strateške studije „Panon“ iz Osijeka, Vukovarsko srijemske županije i Centra za kompetencije i razvoj iz Vinkovaca, te ujedno i japanskih i hrvatskih znanstvenika, istodobno je obilježila 25. obljetnicu diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske.
- 21. rujna, ravnatelj HCR-a, ugostio je na radilištu razminiranja u naselju Dabar, u Ličko – senjskoj županiji, novinare talijanske nacionalne radiotelevizije - RAI, koja je iskazala zainteresiranost za snimanje reportaže o hrvatskom protuminskom djelovanju te aktivnostima Hrvatskog centra za razminiranje.
- Od 1. do 5. listopada, 2018., Hrvatski centar za razminiranje ugostio je predstavnike Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) obzirom je Republika Hrvatska odabrana je kao dobar primjer za provođenje istraživačkog projekta pod nazivom "Nacionalni kapaciteti i preostala kontaminacija". Navedeni projekt je pod vodstvom Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD), provodi se uz potporu Ureda za uklanjanje i redukciju oružja, koji je dio Ureda za političko-vojne poslove američkog State Departmenta (PM/ WRA), a s namjerom istraživanja sustava i procesa koji su aktivni ili planirani za upravljanje preostalim onečišćenjem eksplozivnim ostacima rata. Hrvatski centar za razminiranje je tom prigodom osigurao obuhvatnu potporu navedenom projektu te organizirao sastanke sa svim relevantnim dionicima protuminskog sustava

Republike Hrvatske. (HCR, MUP, MORH, Ured za razminiranje Vlade RH, UV HCR-a, HCR-CTRO d.o.o., HUP-Udruga poslodavaca u humanitarnom razminiranju.)

- Od 18. do 19. listopada, 2018., ravnatelj HCR-a sudjelovao je na Konferenciji "Humanitarno razminiranje u BiH – Put do završetka" koja se održala u Sarajevu, a gdje je predstavio dobru međusobnu suradnju dvaju susjednih protuminskih sustava RH i BiH. Navedena konferencija organizirana je od strane Ministarstva civilnih poslova BiH u suradnji s Komisijom za razminiranje i Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Odluke Vijeća Europske unije i Jedinice za provedbu Konvencije o zabrani uporabe PP mina.
- 22. listopada, 2018., ravnatelj HCR-a sudjelovao je, kao Odlukom Vlade RH, imenovani član na 58. sjednici Upravnog odbora ITF-a. Na predmetnoj sjednici je podneseno polugodišnje izvješće o radu, portfelj projekata za 2019. godinu te nove smjernice odnosno optimizacija proračuna uz tekuće zadaće ITF-a.
- 29. listopada, 2018., u okviru završne kontrole kvalitete na radilištu u Vagancu, u Ličko – senjskoj županiji, ravnatelj HCR-a, razgovarao je s novinarima ITV Velika Britanija. Intervju je od strane britanske TV mreže zatražen ponajprije u svjetlu migrantske krize, odnosno njihovoj pretpostavci o potencijalnoj ugrozi kretanju migranta kroz minski sumnjivo područje Republike Hrvatske. Novinari su također upoznati sa stanjem MSP-a Republike Hrvatske te rokovima u kojima se planira ispuniti obveza preuzeta Ottawskom konvencijom, odnosno potpuna očišćenost RH od mina.
- 14. studenog 2018. godine u Zalakarošu, u Mađarskoj, održana je konferencija najboljih projekata iz prakse u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., na kojoj je predstavljen i projekt „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“ akronima De-mine HU-HR II, inače 1. strateškog projekta navedenog Programa prekogranične suradnje. Na konferenciji je u ime HCR-a nazočila načelnica Odjela za EU fondove, a provedbu i rezultate navedenog projekta predstavio je viši savjetnik za EU fondove.
- Od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi je održan 17. sastanak država članica Konvencije o zabrani uporabe protupešačkih mina, poznatije kao Ottawska konvencija. Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno veleposlanicom, stalnom predstavnicom Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi dr. Vesnom Batistić Kos, na navedenom je sastanku, između predstavnika Stalne misije UN-a, Ureda za razminiranje Vlade RH te MORH-a, predstavljao ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje. Na marginama 17. sastanka održani su brojni bilateralni sastanci s predstavnicima ostalih svjetskih centara za protuminskog djelovanje s tematikom razmjena iskustava te osnaživanja daljnje suradnje. Najvažnija tema navedenog sastanka bila je prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu Republike Hrvatske za produžetkom roka za izvršenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. Hrvatski je Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije.

- 27. studenog 2018. godine, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održan je sastanak na temu "Kako poslovati sa Sudanom" kao dio pripreme zainteresiranosti za suradnju i posjet hrvatskog gospodarskog izaslanstva Sudanu koji bi se organizirao krajem siječnja 2019. U sklopu navedenog sastanka sudjelovao je i predstavnik HCR-a kako bi izrazio zainteresiranost za suradnju i razmjenu iskustava obzirom na činjenicu da, nažalost, Sudan također dijeli problematiku minsko sumnjivog prostora kao i Republika Hrvatska.
- Od 17. do 20. prosinca 2018. godine delegacija Hrvatskog centra za razminiranje u sastavu ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje, boravili su u posjetu Tadžikistanu na inicijativu i u organizaciji Programskog Ureda OESS-a u Dušambeu. Između sastanaka s predstavnicima OESS-a, hrvatska delegacija održala je razgovore s predstavnicima tadžikistanskog Centra za protuminsko djelovanje, kao i drugim nacionalnim dionicima protuminskog djelovanja, te posjetila Regionalni centar za eksplozivne opasnosti.

### **3.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.**

U Operativnom programu za konkurentnost i kohezija utvrđen je specifični cilj 6iii3: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže NATURA 2000.

Unutar ovog specifičnog cilja moguće je financirati sljedeće aktivnosti iz protuminskog djelovanja: uklanjanje mina i neeksploziranih ubojnih sredstava, uključujući aktivnosti podizanja svijesti o minama, osiguravanje sigurnog kretanja građana uz područja na kojima su prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina te time stvaranje uvjeta za održivo upravljanje tim područjima; aktivnosti podizanja svijesti o bioraznolikosti i važnosti održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar mreže NATURA 2000 koja su zagađena ili se sumnja na zagađenost minama ili su donedavno bila zagađena minama i stoga se njima nije moglo upravljati.

#### **3.5.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita**

##### Opće informacije o projektu:

- Financiranje iz Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK), Specifični cilj (SC) 6iii.3 „Razminiranje i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“

- Prijavitelj (Korisnik): Hrvatske šume d.o.o.
- Partneri: Hrvatski centar za razminiranje, Vladin ured za razminiranje, Hrvatske vode, Park prirode „Kopački rit“, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
- Ukupna vrijednost projekta: 49,3 milijuna Eura (okvirno 370 milijuna HRK), od kojih za razminiranje: 33,7 milijuna Eura (okvirno 253 milijuna HRK)

Aktivnosti HCR-a na pripremi i provedbi projekta u 2018. godini:

- Financirana je izrada Studije izvodljivosti i Obrasca za velike projekte. U pripremu projekta bili su uključeni i stručnjaci Jaspersa te se posljednjih 6 mjeseci čekala Potvrda o završenosti projekta (Completion Note), koja je bila preduvjet za početak postupka odabira
- Hrvatskim šumama i ostalim projektnim partnerima je dan adekvatan i pravovremen doprinos u svim ostalim elementima bitnima za dovršetak projektne dokumentacije (Troškovnik, Obrazac za prijavu i dr.)
- Izrađena je dokumentacija o nabavi i proveden postupak nabave usluga razminiranja minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji (kako bi se umanjila mogućnost nepravilnosti u postupku nabave razminiranja, dokumentacija o nabavi je prošla i prethodnu kontrolu od strane FZOEU, odnosno SAFU)
- 14. kolovoza donesena je Odluka o financiranju projekta (Odluku o financiranju donijelo je MZOE, kao Posredničko tijelo razine 1)
- 4. rujna potpisan je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Hrvatskih šuma d.o.o. kao Korisnika i projektnih partnera: HCR-a, Hrvatskih voda, JU Park prirode Kopačkog rita, Ureda za razminiranje Vlade RH i Agencije za regionalni razvoj
- 21. rujna sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt NATURAVITA. Potpisnici Ugovora su: Korisnik – Hrvatske šume te Posredničko tijelo razine 1 – MZOE i Posredničko tijelo razine 2 – FZOEU
- Potpisani su ugovori o razminiranju za svih 5 projektnih cjelina, izvoditelji su uvedeni u poslove i poslovi razminiranja su trenutno u tijeku
- pripremljena je i u sustav eFondovi unesena dokumentacija kojom se za sufinanciranje iz EU fondova za poslove razminiranja 8,7 km<sup>2</sup> površine, koji su plaćeni do 20.11.2018. godine, potražuje ukupno 65,8 milijuna kuna (od čega sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 54,7 milijuna kuna). U istom zahtjevu za nadoknadu sredstva (ZNS), potraživat će se još i sredstva za pripremu projektne dokumentacije te za upravljanje projektom
- 6. prosinca, 2018. godine predan je prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji djeluje kao PT2 unutar navedenog projekta.

### 3.5.2. Fearless Velebit

#### Opće informacije o projektu:

- Do kraja 2018. godini radilo se na dovršetku pripreme projekta kojim bi se razminirali i obnovili degradirani i zapušteni šumski ekosustavi u Parku prirode Velebit i ostalim NATURA 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji.
- Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o., a HCR je projektni partner.
- Prema izrađenom idejnom rješenju, planirano razdoblje provedbe projekta je od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2023. Godine.
- Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 40,8 milijuna eura, od čega je za poslove razminiranja namijenjeno 33,3 milijuna eura, a provedbom projekta se planira razminirati 16,46 km<sup>2</sup> šuma i šumskog zemljišta na području PP Velebit i NP Paklenica.

#### Aktivnosti HCR-a na pripremi projekta u 2018. godini:

- 16. veljače održana su 2 sastanka, a kako bi se sa projektom krenulo u pripremu i to u Hrvatskim šumama i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
- U ožujku su MZOE-u i projektnom partneru digitalno dostavljeni prioriteti razminiranja te planirane jedinične cijene za tri sektora projekta kao i planirano potrebno vrijeme razminiranja prema sektorima. Također, poslani su i podaci o jediničnim cijenama razminiranja po m<sup>2</sup> za sve realizirane projekte razminiranja od 1998. do danas na širem području projekta.
- U HCR-u je održan sastanak 18. travnja 2018. godine s konzultantom i predstavnikom MZOE. Svi podaci zatraženi od strane konzultanta istom su i dostavljeni u zadanim rokovima. Prema dostupnim informacijama konzultant je poslao prijavu projekta MZOE-u tijekom travnja.
- Početkom lipnja (4.6.) od strane MZOE dostavljen nam je konačni prijedlog idejnog rješenja i logička matrica te se pristupilo daljnjoj razradi projektne dokumentacije.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za EU sufinanciranje iz OPKK (SC 6iii3)
- Nastavno na sastanak održan u prostorijama Hrvatskih šuma od 26. studenoga 2018., te prethodno proveden postupak javne nabave od strane korisnika projekta (HŠ) odabran je ponuditelj za izradu studije izvedivosti „Sense Consulting“ te je u tijeku izrada predmetne studije.

### 3.5.3. „Karlovac Karst“

#### Opće informacije o projektu:

- U 2018. godini u suradnji sa MZOE i ostalim mogućim dionicima/partnerima započela je priprema idejnog projekta naziva „KARLOVAC KARST“ kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim Natura 2000 područjima.

- Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 250 milijuna kuna (33 mil. EUR), a procijenjena vrijednost aktivnosti razminiranja je oko 200 milijuna kuna (26 mil. EUR).
- Razdoblje provedbe projekta: 2019/2020 – 2023. Godina.
- Trenutni status: U tijeku je finalizacija dogovora oko projektnog partnerstva s Hrvatskim šumama te definiranje projektnog područja s MZOE.

#### **3.5.4. Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta**

U razdoblju 1. siječnja do 31. svibnja 2018. godine nastavljeno je i u cijelosti završeno sa razminiranjem površina ugovorenih u 2016. godini, a na temelju natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (nadalje u tekstu: EPFRR) za dodjelu potpore za «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) raspisala je 4. svibnja 2016. godine. Ugovoreno je svih 17 projekata u 7 županija površine 25.062.140 m<sup>2</sup>. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 207.179.774,40 Kn sa PDV-om.

Poslovi su završeni u svim županijama (pregled odrađenog i preostalog u tablici 3.9.). Razlika razminiranog i ugovorenog je na površinama na kojima se u tijeku radova naišlo na obrađene poljoprivredne površine ili u slučaju nailaska na velike količine MES-a i NUS-a (kao što je propisano Zakonom o protuminskom djelovanju), te su one isključene anexom ugovora.

Natječaj za III. fazu razminiranja poljoprivrednog zemljišta objavljen je 23. ožujka 2018. godine i trajao je do 13. travnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom javnom natječaju iznosi 104 mil. kuna (udio javne potpore u prihvatljivim troškovima je 100%). Prihvatljivi korisnici su JLS na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina (a to su Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka županija) kojima smo na temelju njihovog zahtjeva, a sukladno natječaju, pružili tehničku pomoć u pripremi potpune dokumentacije za prijavu na isti.

Također, određene su i osobe koje će kao tehnička i stručna pomoć biti na raspolaganju Županijama kroz cijeli proces, kao i do sada (Odlukom pravne službe).

Sisačko-moslavačka županija je u svibnju (za 4 idejna plana) i lipnju (za 2 idejna plana) raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima koje je izradio HCR, dok je Ličko-senjska županija u lipnju raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima koje je izradio HCR (svih 13).

Do 31. prosinca 2018. godine radovi su ugovoreni za svih 19 projekata (13 u LSŽ, 6 u SMŽ) na ukupnoj površini od 10.879.333 m<sup>2</sup> (iz EPFRR 9.897.531 m<sup>2</sup>). Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 112.427.989,15 Kn (iz EPFRR 102.136.990,72 kuna).

Radovi su započeli i u tijeku su na 16 projekata (od čega su na 16 projekata i završeni – 4 u SMŽ i 12 u LSŽ), odnosno do sada je odrađeno 9.918.438 m<sup>2</sup>, što iznosi 91,17% ugovorene površine.

### 3.5.5. Švicarski program pomoći

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji će se provoditi u razdoblju od 2016.–2024. godine potpisan je u lipnju 2015. godine.

Švicarsko–hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz osam projekata između kojih je i „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ koji se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. U okviru projekta Hrvatski centar za razminiranje ima ulogu Izvršne agencije, Ured za razminiranje ulogu Posredničkog tijela dok Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije djeluje kao Nacionalna koordinacijska jedinica.

Za navedeni projekt predviđena je ukupna vrijednost od 3,53 milijuna CHF, od čega bi švicarska darovnica iznosila 3 mil. CHF, a udio proračuna RH 530.000 CHF. Projekt će omogućiti realizaciju poslova razminiranja 1,8 km<sup>2</sup> minskih polja unutar Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji i provedbu ostalih poslova iz protuminskog djelovanja povezanih s poslovima razminiranja.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine, o čemu nas je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 25. siječnja 2017. godine.

#### Aktivnosti HCR-a na pripremi i provedbi projekta u 2018. godini:

- 18. siječnja, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je redoviti mjesečni sastanak na kojem su sudjelovali uz predstavnike HCR-a kao Izvršne agencije, sudjelovali predstavnici Posredničkog tijela (Ured za razminiranje Vlade RH) te Nacionalne koordinacijske jedinice (MRRFEU). Na predmetnom sastanku raspravljalo se o tehničkim pitanjima projektne

dokumentacije, pripreme prvog Godišnjeg i Periodičnog izvješća te ostalim aktivnostima projekta.

- 7. veljače, održan je radni sastanak s predstavnicima Ureda za razminiranje Vlade RH, Posredničkog tijela na projektu „Razminiranje i društveno gospodarska integracija“, gdje se raspravljalo o izradi godišnjeg i privremenog izvješća.
- Od 13. do 16. veljače, u sklopu 21. sastanka ravnatelja nacionalnih protuminskih sustava i savjetnika UN (NDM21) koji se održao u Ženevi, g. Pascalu Rapillardu, predstojniku Ureda direktora Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD) predstavljen je projekt „Razminiranje i društveno gospodarska integracija“.
- 2. ožujka, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije i Posredničkog tijela na kojem se razgovaralo o uspješnom izvršenju obaveza vezanih uz predaju godišnjeg i periodičnog izvješća te provedbi aktivnosti projekta.
- 13. ožujka, održan je koordinacijski sastanak u prostorijama HCR-a sa javno izabranim ponuditeljem za uslugu Tehničke pomoći na projektu gdje se razgovaralo o preliminarnom planu izvedbe aktivnosti po predmetu nabave.
- 14. ožujka, održan je sastanak u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva između predstavnika HCR-a i SDURDD-a, a na kojem se razgovaralo o mogućnostima izvedbe pojedinih aktivnosti projekta te eventualnoj potpori koju navedeni Središnji ured može pružiti.
- 27. ožujka, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac potpisala je u Zagrebu 10 ugovora o provedbi projekata u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje s predstavnicima niza institucija, između kojih i s Zdravkom Modrušanom, ravnateljem u ime Hrvatskog centra za razminiranje te Hrvojem Debačom, u ime Ureda za razminiranje.
- 17. travnja, na inicijativu HCR-a, izvršne agencije na projektu, održan je sastanak u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske gdje se razgovaralo o provedbi aktivnosti socio-ekonomskog osnaživanja te iskustvu koje navedeni Ured može ponuditi u tom kontekstu.
- 23. travnja, u prostorijama Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske održan je redoviti mjesečni sastanak između predstavnika projektnih tijela, HCR-a (Izvršne agencije), Ureda za razminiranje (Posredničkog tijela) te MRRFEU-a (Nacionalne koordinacijske jedinice). Na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima, projektnoj dokumentaciji, budućim planiranim aktivnostima te skorašnjem održavanju Tehničke misije projekta.
- zaključno s 26. travnja, HCR kao izvršna agencija na projektu, uspješno je predala prema Uredu za razminiranje (Posredničkom tijelu) Periodično financijsko izviješće te Godišnje izviješće projekta, kao i zahtjev za odobrenje početka postupka javne nabave za aktivnost razminiranja. Također su definirani predstavnici HCR-a u Upravljačkom odboru projekta, kao i formalizirana Jedinica za implementaciju projekta.
- 17. svibnja, održan je sastanak u okviru Tehničke misije Švicarsko-hrvatskog programa suradnje tijekom kojega su predstavnici Izvršne agencije (HCR) te

Posredničkog tijela (Ured za razminiranje) upoznali švicarske donatore s posljednjim informacijama vezanima uz implementaciju projekta. Također, istoga dana, održan je i prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta.

- 25. svibnja, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Narodne novine i Službeni glasnik Europske unije, objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 četvornih metara.
- 12. lipnja, održan je sastanak predstavnika HCR-a i Hrvatskih šuma na lokaciji UŠP Sisak gdje se raspravljalo o gospodarskoj revitalizaciji i integraciji prostora koji će biti razminiran u sklopu ovog projekta.
- 28. lipnja, održan je redoviti mjesečni sastanak projektnih tijela u Uredu za razminiranje Vlade Republike Hrvatske na kojem su se razmjenjivale tehničke informacije i razrađivale planirane aktivnosti na projektu.
- 17. srpnja, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije i Posredničkog tijela na kojem se razgovaralo o uspješnom izvršenju obaveza vezanih uz predaju godišnjeg i periodičnog izvješća te provedbi aktivnosti projekta.
- 30. srpnja, u sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje potpisan je Ugovor o razminiranju minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 m<sup>2</sup>. U ime HCR-a ugovor je potpisao ravnatelj Zdravko Modrušan, a u ime izvoditelja zajednice ponuditelja, vodeći partner TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. Vrijednost ugovora, koji se 85% financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, iznosi 18.932.935,83 kuna, a poslovi će biti dovršeni za 77 radnih dana.

R.br.	Oznaka projekta	Naziv projekta	Županija	Tvrтка	Izvor financ.	Trenutni status	Površina na m <sup>2</sup>	Realizacija a ukupno m <sup>2</sup>	Pronađen MES i NUS		
									PP	PO	NUS
1	PR-SMPET-021-05-17	G.J. Kotar – Stari Gaj	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	Švicarsko-hrvatski program suradnje / DP	Ponavljanje radova	1.749.001	1.749.001	2.750	7	830

Tablica 3.14. Realizacija na projektu

- 24. kolovoza, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne koordinacijske jedinice na kojem je g. Laura, voditelj projekta, upoznao prisutne o toku radova razminiranja, izvrsnim rezultatima te planiranim budućim aktivnostima na projektu.
- 4. rujna, održan je koordinacijski sastanak u prostorijama HCR-a između predstavnika Izvršne agencije i odabranog pružatelja usluge tehničke pomoći, tvrtke Pro-konzalting, na kojem se razgovaralo o pripremi natječajne dokumentacije za aktivnosti formiranja baze podataka i terenskog prikupljanja podataka.

- 17. rujna, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održana je prva sjednica Povjerenstva za praćenje Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na kojoj su sudjelovali i imenovani predstavnici HCR-a.
- 25. rujna, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne koordinacijske jedinice na kojem je g. Laura, voditelj projekta, upoznao prisutne o toku radova razminiranja, izvrsnim rezultatima te planiranim budućim aktivnostima na projektu.
- 9. listopada održana je uvodna konferencija za projekt, na kojoj su prisustvovali predstavnici Ureda za razminiranje, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Sisačko – moslavačke županije, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, Ministarstva unutarnjih poslova, UV HCR-a, predstavnici tvrtki za razminiranje te predstavnici medija.
- 23. listopada održan je sastanak između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela, Nacionalne koordinacijske jedinice i Ministarstva uprave, a vezano uz mogućnosti integracije baze podataka o minskim žrtvama koja će se izrađivati u okviru ovog projekta u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)
- 29. listopada održan je mjesečni koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne koordinacijske jedinice
- Od 12. do 16. studenoga 2018. u Zagrebu je u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održana Tehnička misija u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. U sklopu navedene Tehničke misije, 16. studenoga 2018. organiziran je posjet Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku i području Kotar šume. Predstavnicu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) Adrienne Fehr sa suradnicima ugostio je ravnatelj HCR-a Zdravko Modrušan u sjedištu Centra, nakon čega su u Kotar šumi prezentirani rezultati navedenog projekta razminiranja te je održan razgovor s predstavnikom minskih žrtava, ujedno stanovnikom obližnjeg naselja na temu značaja realizacije ovog programa široj zajednici.
- 14. prosinca, 2018. godine održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne koordinacijske jedinice na kojem se razgovaralo o provedbi projekta u budućem razdoblju nakon 1. siječnja 2019., te zaključcima sastanka Tehničke misije, izvršenim i planiranim aktivnostima, te postupcima javne nabave/plaćanju odnosno izvještajnim obvezama za naredni period.

### 3.5.6. INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Unutar INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. projekt naziva „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“, uvršten je kao strateški projekt. Vodeći partner je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s mađarske strane su policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz Mađarske. Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 eura za aktivnosti koje provodi Hrvatski centar za razminiranje odobreno je 1.789.181,74 eura. Ugovor o sufinanciranju s Upravljačkim tijelom potpisan je 21. srpnja 2016. godine.

Ukupno ugovorena i razminirana površina iznosi 1.456.319 m<sup>2</sup>, a preostala ugovorena površina koja se razminirala u 2017. godini iznosi 3.400 m<sup>2</sup>. U suradnji s Državnom geodetskom upravom, u sklopu projekta bit će dopunjene i obnovljene i granične oznake između Republike Hrvatske i Mađarske na dijelu sektora D od granične oznake D1 – D211 te od D260 –D417.

U veljači 2018. godine je potpisan II. Dodatak Sporazumu o suradnji DGU-a i HCR-a na projektu De-mine HU-HR II, kojim je definirana suradnja na provedbi stručnog nadzora na aktivnostima stabilizacije i izmjere stalnih točaka geodetske osnove, geodetske izmjere graničnih oznaka na dijelu sektora D (D1-D211 i D260-D417) te izrade nacрта novih graničnih dokumenata državne granice između Republike Hrvatske i Mađarske.

HCR je od 22. do 25. travnja 2018. organizirao tematsku radionicu „Razminiranje i geodetski radovi“ u Toplicama Sveti Martin na Muri na kojoj su uz članove projektnog tima HCR-a sudjelovali i kolege iz Policije Županije Baranya (projektni partner), Državne geodetske uprave, predstavnici izvoditelja razminiranja, Vladinog Ureda iz Budimpešte te članovi Mješovite hrvatsko-mađarske stručne skupine.

Od 14. do 16. svibnja 2018., u Karancu je održana druga radionica projekta De-mine HU-HR II u organizaciji HCR-a, na temu "Analiza rezultata projekta De-mine HU-HR II". Rezultate projekta predstavili su: članovi projektnog tima HCR-a – vodećeg partnera projekta, Policijske uprave županije Baranya i Uprave Nacionalnog parka Dunav – Drava te predstavnici Državne geodetske uprave i tvrtki izvoditelja geodetskih radova – Geoprem d.o.o. uz nazočnost i predstavnika tvrtke Geomatika d.o.o. koja je također izvodila geodetske radove. Zaključeno je da su svi rezultati projekta ostvareni, a rezultati razminiranja i geodetskih radova i višestruko premašeni.

Dana 25. svibnja, 2018. godine, u Villanyju u Mađarskoj, održana je Završna konferencija projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“. Tijekom dvije godine provedbe, a kroz niz aktivnosti HCR-a razminirano je 1,53 km<sup>2</sup> inundacijskog pojasa rijeka Drave i Dunava na području gradova Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca te

općina Petlovac i Draž pri čemu je uklonjeno 36 minskih polja te pronađeno i uništeno ukupno 306 minskoeksplozivnih i neeksplozivnih ubojnih sredstava. Uz razminiranje, jedna od glavnih aktivnosti projekta bili su i geodetski radovi na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske. U okviru projekta obnovljeno je 560 graničnih oznaka i očišćeno 70 km granične prosjeke u sektoru D. Kao dodana vrijednost projektu, izmjerene su granične oznake na graničnoj crti u novom referentnom koordinatnom sustavu HTRS96, modernizirana granična dokumentacija (radna verzija) te je uspostavljeno 5 stalnih točaka geodetske osnove uz državnu granicu koje će poslužiti za održavanje graničnih oznaka i za povezivanje geodetskih datuma Republike Hrvatske i Mađarske.

### **Provedba ovoga strateškoga projekta završila je 31. svibnja 2018. godine.**

U organizaciji Zajedničkog tajništva za Prekogranični program Mađarska – Hrvatska (HU-HR), 14. studenog je u Zalakarosu (Mađarska) održana konferencija na kojoj su predstavljeni primjeri najbolje prakse među projektima koji su do sada financirani iz Programa, a jedan od prezentiranih projekata bio je i „De-contamination of war-affected territories“

Kako je provedba ovoga strateškoga projekta završila 31. svibnja 2018. godine, te su odrađene obveze prema 3 izvještajna razdoblja za sve partnere, odnosno HCR je prosljedio svim partnerima prijavljena i odobrena sredstva za njihove aktivnosti, preduvjet za uplate za ostala 3 izvještajna razdoblja je unos i odobrenje svih izvješća u monitoring sustav IMIS. Do kraja prosinca 2018. uneseno je i odobreno pet od šest partnerskih izvještaja, pri čemu je pokrenuta i isplata odobrenih iznosa prema partnerima. Unos i odobrenje posljednjeg šestog izvješća, te isplata verificiranih sredstava prema partnerima, očekuje se u siječnju 2019. godine.

### **3.5.7. Provedba projekata financiranih sredstvima pretpristupnih programa IPA-I. komponeneta i Prijelaznog instrumenta**

Provedba 5 grant ugovora iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta, ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura, završena je. Realizacijom navedenih ugovora planirano je razminirati 9,5 km<sup>2</sup>, a razminirano je 9,7 km<sup>2</sup> minski sumnjivih površina uz granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Do kraja prosinca 2018. godine zaprimljena su revizijska izvješća za svih 5 Grant ugovora pri čemu su istovremeno izrađena i Završna izvješća po istim ugovorima, te se očekuje slanje istih prema SAFU-u početkom siječnja 2019. godine.

OSNOVNI PROJEKTI						
Program	Naziv projekta (grant ugovor)	Provedba	Udio EU	Udio RH	POVRŠINA RAZMINIRANJA	REALIZACIJA RAZMINIRANJA NA DAN 31.12.2017.
			(eur)	(eur)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0401	23.11.2016. - 23.02.2018.	1.170.000,00	206.471,00	1.367.000	1.384.502
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-04-02	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.711.999,80	478.588,20	2.500.463	2.546.374
IPA 2013	Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji (II.dio) GC 2013-01-36-0101	29.11.2016. - 28.02.2018.	1.161.000,00	204.882,00	1.349.000	1.368.115
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1/M3-O4-01	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.075.000,00	366.176,00	2.425.270	2.500.251
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1-M3-O4-02	09.12.2016. - 09.03.2018.	1.923.999,80	339.529,20	1.873.774	1.889.654
<b>UKUPNO</b>			<b>9.041.999,60</b>	<b>1.595.646,40</b>	<b>9.515.507</b>	<b>9.688.896</b>

Tablica 3.15. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz prepristupnih fondova-osnovni projekti

REALOKACIJE PO UGOVORIMA						
Program	Naziv projekta (grant ugovor)	Provedba	Udio EU	Udio RH	POVRŠINA RAZMINIRANJA NAKON REALOKACIJE	REALIZACIJA RAZMINIRANJA NA DAN 31.12.2017.
			(eur)	(eur)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0401	23.11.2016. - 23.02.2018.	1.170.000,00	206.471,00	17.502	17.502
IPA 2012	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-moslavačkoj županiji GC 2012-01-23-0402	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.711.999,80	478.588,20	42.032	42.032
IPA 2013	Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji (II.dio) GC 2013-01-36-0101	29.11.2016. - 28.02.2018.	1.161.000,00	204.882,00	19.115	19.115
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1/M3-O4-01	29.11.2016. - 28.02.2018.	2.075.000,00	366.176,00	25.880	25.880
Transition Facility (Prijelazni instrument)	Razminiranje područja duž granice sa Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj županiji GC TH/HR/P1-M3-O4-02	09.12.2016. - 09.03.2018.	1.923.999,80	339.529,20	74.981	74.981
<b>UKUPNO</b>			<b>9.041.999,60</b>	<b>1.595.646,40</b>	<b>179.510</b>	<b>179.510</b>

Tablica 3.16. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz prepristupnih fondova-realokacija

U Kući Europe u Zagrebu, 9. veljače održana je zajednička završna konferencija za ugovor iz programa IPA 2013 i 2 ugovora iz Prijelaznog instrumenta.

Službeno je u siječnju SAFU-u dostavljena dokumentacija za zatvaranje programa IPA 2010 – za 3 grant ugovora (2010-01-36-04, 2010-01-36-0401, 2010-01-36-0402) nakon suglasnosti Nacionalnog fonda.

U 2018. godini obavljena je revizija projekta „Razminiranje socio-gospodarske infrastrukture na području Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Zadarske županije“ grant ugovora 2013-01-36-01 (provedba završena 2015. godine) od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

### **3.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima**

Potpisivanjem i ratifikacijom Ottawske konvencije Republika Hrvatska se obvezala utvrditi sva područja koja su zagađena protupješačkim minama i ukloniti sve protupješačke mine. Republika Hrvatska je utvrdila zagađena područja i zatražila produljenje roka za uklanjanje svih protupješačkih mina s 2009. za sljedećih deset godina. Republici Hrvatskoj je odobren produžetak roka izvršenja obveze preuzete Konvencijom do 1. ožujka 2019. godine.

Sukladno analizama u razdoblju provedbe važećeg Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine koji je temeljen na cilju ima upravo ispunjenje članka 5., nedostatna financijska sredstva u razdoblju 2010.-2014., odnosno u polovici ukupnog razdoblja provedbe temeljni su razlog za neostvarenja Programa u dijelu koji se odnosi na planirano smanjenje veličine MSP-a, čime se i dinamika provođenja prioriteta kao i planirano vrijeme provedbe istih prolongiraju.

Nacrt zahtjeva za produljenje roka dovršenja (REQUEST or an extension of the deadline for completing the destruction of antipersonnel mines in mined areas in accordance with Article 5, paragraph 1) izrađen je (do kraja veljače) u suradnji s Uredom za razminiranje i nadležnim ministarstvima te Jedinicom za podršku provedbe Konvencije iz Ženeve, a sadrži precizno definirane aktivnosti, potrebne kapacitete i pripadajuća financijska sredstva nužna da se u razumno mogućem roku ispune obveze iz članka 5. Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima sadržane u Ottawskoj konvenciji te utvrde uvjeti za uklanjanje preostalog MSP-a Republike Hrvatske. Prilikom izrade predmetnog zahtjeva posebna se pažnja posvetila činjenici da su se sve države članice Ottawske konvencije potpisom Deklaracije iz Maputa 2014. godine obvezale da će uložiti sve raspoložive napore kako bi do 2025. ostvarile temeljni cilj - svijet bez protupješačkih mina.

Nacrt 2. Zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH (traži se produljenje ispunjenja obveza do ožujka 2026. godine) sukladno članku 5. Konvencije o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju te pripadajući atlas s kartama minski sumnjivih površina RH dostavljen je (polovicom ožujka) MUP-u, MVEP, Ministarstvu financija i Vladinom uredu za razminiranje na mišljenje. Nakon njihovog mišljenja te korekcija i dopuna, Zahtjev je poslan Vladi RH na daljnje postupanje i proceduru.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 29.03.2018. godine, Ured za razminiranje je dostavio MVEP-u 2. Zahtjev za produljenje roka razminiranja RH sukladno članku 5. Konvencije o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju te pripadajući atlas s kartama minski sumnjivih površina RH uz zamolbu za prosljeđivanje nadležnim tijelima Konvencije.

Dana 8. lipnja, ravnatelj HCR-a i pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje sudjelovali su na Anti-Personnel Mine Ban Convention Intersessional meeting u Ženevi. Ondje je prezentiran drugi zahtjev Republike Hrvatske za produženjem roka završetka rješavanja minskog problema u RH sukladno članku 5. Ottawske konvencije.

Od Jedinice za provedbu Ottawske konvencije, Ženeva, 12. rujna dobili smo očitovanje na sažetak 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH i očitovanje na analizu 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH koju je pripremio Odbor za provedbu članka 5. Oba dokumenta (sažetak/analiza) koje je pripremio Odbor za provedbu članka 5. i dostavio ih na mišljenje RH, baziraju se na tekstu 2. zahtjeva i kao takvi su standardan dio procesa podnošenja, prezentacije, analize i razmatranja svakog zahtjeva za produljenje roka razminiranja. Nakon što je UN putem Stalne misije RH u Ženevi zaprimio naše odgovore, dokumenti su revidirani i prevedeni na službene jezike UN-a te do kraja rujna objavljeni na webu ISU-a kao službeni dokumenti predstojećeg 17. sastanka država stranaka Ottawske konvencije (Ženeva, 26.-30. studeni 2018.) na kojem su države donijele konačnu odluku o hrvatskom zahtjevu. **Zaključno, u predmetnoj analizi konkretno su pohvaljeni svi akteri u RH koji su odradili ovaj posao čime se pokazuje zašto se Republika Hrvatska s pravom percipira kao zasebna klasa u protuminskom djelovanju.**

Od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi je održan 17. sastanak država članica Konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, poznatije kao Ottawska konvencija. Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno veleposlanicom, stalnom predstavnicom Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi dr. Vesnom Batistić Kos, na navedenom je sastanku, između predstavnika Stalne misije UN-a, Ureda za razminiranje Vlade RH te MORH-a, predstavljao i ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje. Najvažnija tema navedenog sastanka bila je prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu Republike Hrvatske za produženjem roka za izvršenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. **Hrvatski je Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije.**

#### 4. Financiranje plana

Donošenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu ukupan izvorni financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje (glava u razdjelu 04035) za 2018. godinu iznosio je 288.842.100,00 kuna. Nakon Rebalansa Državnog proračuna za 2018. godinu i Preraspodjela odobrenih od strane ministra financija Tekući financijski plan za 2018. godinu iznosio je 387.365.800,00 kuna.

04035 HCR - FINANCIJSKI PLAN 2018.						
Aktivnost Izvor	Opis	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 31.12.2018.		
		kn	kn	kn	% u odnosu na Izvorni plan	% u odnosu na Tekući plan
1	2	3	4	5	6	7
					(5/3)*100	(5/4)*100
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>288.842.100,00</b>	<b>387.365.800,00</b>	<b>373.682.886,49</b>	<b>129,37</b>	<b>96,47</b>
<b>04035</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>288.842.100,00</b>	<b>387.365.800,00</b>	<b>373.682.886,49</b>	<b>129,37</b>	<b>96,47</b>
<b>A672007</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>241.130.000,00</b>	<b>236.802.777,71</b>	<b>165,60</b>	<b>98,21</b>
11	Opći prihodi i primici	140.500.000,00	137.000.000,00	132.848.339,65	94,55	96,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	100.630.000,00	100.625.392,67		100,00
52	Ostale pomoći	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	90,00
61	Donacije	2.000.000,00	3.000.000,00	2.879.045,39	143,95	95,97
<b>A672032</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>45.980.000,00</b>	<b>40.571.675,91</b>	<b>84,52</b>	<b>88,24</b>
11	Opći prihodi i primici	48.000.000,00	45.900.000,00	40.488.392,57	114,13	88,21
52	Ostale pomoći	0,00	80.000,00	83.283,34		104,10
<b>A672033</b>	<b>IPA 2013 RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ, ZŽ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>913.218,12</b>	<b>3.652,87</b>	<b>99,59</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00		
51	Pomoći EU	25.000,00	917.000,00	913.218,12	3.652,87	99,59

<b>T672037</b>	<b>IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>131.585,01</b>	<b>263,17</b>	<b>95,35</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00		
51	Pomoći EU	50.000,00	138.000,00	131.585,01	263,17	95,35
<b>T672038</b>	<b>DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>8.042.300,00</b>	<b>7.337.746,26</b>	<b>117,12</b>	<b>91,24</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0,00	8.042.300,00	7.337.746,26	117,12	91,24
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.265.000,00				
<b>T672039</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>58.800,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>125.699,50</b>	<b>213,77</b>	<b>97,59</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00		
51	Pomoći EU	58.800,00	128.800,00	125.699,50	213,77	97,59
<b>T672040</b>	<b>NATURAVITA 2014-2020</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>69.810.776,18</b>	<b>103,42</b>	<b>99,73</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	10.150.000,00	10.500.000,00	10.471.616,37	103,17	99,73
562	Pomoći EU	57.350.000,00	59.500.000,00	59.339.159,81	103,47	99,73
<b>T672041</b>	<b>REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	747,97		
<b>T672042</b>	<b>ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE</b>	<b>23.943.300,00</b>	<b>21.029.700,00</b>	<b>17.988.659,83</b>	<b>75,13</b>	<b>85,54</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	3.604.300,00	3.254.300,00	2.702.883,09	74,99	83,06
552	Pomoći EU	20.339.000,00	17.775.400,00	15.285.776,74	75,16	85,99

## Pregled po izvorima sredstava

Izvor	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje/kn	IP %	TP %
11	Opći prihodi i primici	188.500.000,00	182.900.000,00	173.336.732,22	91,96	94,77
12	Sredstva učešća za pomoći	13.754.300,00	13.754.300,00	13.174.499,46	95,78	95,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	100.630.000,00	100.625.392,67	-	100,00
51	Pomoći EU	133.800,00	1.183.800,00	1.170.502,63	874,82	98,88
562	Kohezijski fond (KF)	57.350.000,00	59.500.000,00	59.339.159,81	103,47	99,73
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0,00	8.042.300,00	7.337.746,26	-	91,24
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.265.000,00	-	-	-	-
52	Ostale pomoći	500.000,00	580.000,00	534.031,31	106,81	92,07
552	Švicarski instrument	20.339.000,00	17.775.400,00	15.285.776,74	75,16	85,99
61	Donacije	2.000.000,00	3.000.000,00	2.879.045,39	143,95	95,97
<b>UKUPNO</b>		<b>288.842.100,00</b>	<b>387.365.800,00</b>	<b>373.682.886,49</b>	<b>129,37</b>	<b>96,47</b>

Tablica 4.1. Pregled sredstava za protuminsko djelovanje u 2018. godini – Državni proračun

Prema izvorima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 173.336.732,22 kuna, učešća proračuna Republike Hrvatske u pomoći Europske Unije (izvor 12) u iznosu 13.174.499,46 kuna, ostali prihodi za posebne namjene (sredstva Općekorisnih funkcija šuma – OKFŠ) (izvor 43) u iznosu 100.625.392,67 kuna, pomoći Europske unije (izvor 51) u iznosu 1.170.502,63 kuna, Kohezijski fond (izvor 562) u iznosu 59.339.159,81 kuna, Europski fond za regionalni razvoj (izvor 559) u iznosu 7.337.746,26 kuna, pomoći vlada i međunarodnih organizacija (izvor 52) u iznosu od 534.031,31 kuna, Švicarski instrument pomoći (izvor 552) u iznosu 15.285.776,74 kuna, te donacija trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države, koji se ostvaruju kroz Državni proračun (izvor 61) u iznosu 2.879.045,39 kuna.

Od ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu u iznosu 387.365.800,00 kuna, utrošeno je 373.682.886,49 kuna, što je 129,37% u odnosu na Izvorni financijski plan za 2018. godinu, odnosno 96,47% od Tekućeg financijskog plana za 2018. godinu (nakon rebalansa i preraspodjela).

#### 4.1. Financiranje poslova razminiranja

Temeljem Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu financiranje poslova razminiranja je planirano iz Državnog proračuna, iz sredstava pomoći EU, sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, sredstava Državnog proračuna s posebne pozicije naknade za Općekorisne funkcije šume koju prikuplja Ministarstvo poljoprivrede, sredstava donacija koje su uplaćivane u Državni proračun, te iz

Europskog poljoprivrednog fonda čiji korisnici su županije koje se neposredno plaćale obavljane poslove razminiranja.

IZVOR SREDSTAVA	PLANIRANA SREDSTVA	REALIZIRANA SREDSTVA
<b>DRŽAVNI PRORAČUN</b>	<b>262.180.000,00</b>	<b>320.349.034,30</b>
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.960.000,00	127.187.579,23
12 SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	13.033.000,00	13.160.746,56
51 POMOĆI EU	0,00	893.849,73
562 KOHEZIJSKI FOND ( Naturavita )	57.350.000,00	59.329.979,81
563 EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	574.856,27
52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	500.000,00	450.000,00
61 DONACIJE	2.000.000,00	2.879.045,39
552 ŠVICARSKI INSTRUMENT POMOĆI	16.337.000,00	15.247.584,64
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA)	40.000.000,00	100.625.392,67
<b>EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND (plaćanja su vršile Županije)</b>	<b>135.597.791,62</b>	<b>66.425.283,01</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>397.777.791,62</b>	<b>386.774.317,31</b>

Tablica broj 4.2 . Planirana i realizirana financijska sredstva

\*Detaljnije u poglavlju 4.1.2.

Od ukupno realiziranih financijskih sredstva za poslove razminiranja u 2018. godini, iz EU izvora (+ Švicarski instrument pomoći) osigurano je 36,8%, iz sredstava DPR (Opće korisne funkcije šuma) osigurano je 26% dok je ostatak osiguran iz Državnog proračuna.

#### 4.1.1. Donacije

U 2018. godini planirana su donatorska sredstva (donacije i ostale pomoći i darovnice) u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a realizirana su, tj. obavljani su i plaćeni poslovi razminiranja u iznosu od 3.329.045,39 kuna.

Kao donatore treba posebno istaknuti Hrvatsku elektroprivredu d.d., Udrugu za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže, Američku gospodarsku komoru u RH (AMCHAM), Grad Zagreb i Karlovačku županiju, ali ne treba zaboraviti ni da se s manjim donacijama uključio i veći broj pravnih i fizičkih osoba koje su na taj način pokazale senzibilitet prema protuminskom djelovanju.

Donacija Hrvatske elektroprivrede d.d. iznosila je 2.000.000,00 kuna i utrošena je u iznosu od 1.965.625,00 kuna na razminiranje površina prema idejnom planu „Šumske površine u naselju Novo Selište“ u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ostatak donacije, u iznosu od 34.375,00 kuna, utrošit će se za plaćanje dijela poslova razminiranja površina na području naselja Plastovo, u Šibensko – kninskoj županiji koji bi trebali biti završeni u prvom kvartalu 2019. godine.

Donacija Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže iznosila je 321.584,00 kuna i utrošena je za razminiranje površine 27.790 m<sup>2</sup> prema idejnom planu „Šume u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić“ u Ličko-senjskoj županiji (novac skupljen u okviru akcije „Zagreb – za život bez mina“.

Američka gospodarska komora (AMCHAM) je u suradnji s zadarskom županijom organizirala donatorsku večeru Noć za siguran korak (u studenom 2017. godine) temeljem koje je uplaćena donacija u iznosu od 227.000,00 kuna, te su u tijeku poslovi razminiranja prema idejnom planu „Područje Umac istočno od naselja Pristeg“ u Zadarskoj županiji.

#### **4.1.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta**

Tijekom 2018. godine nastavljeno je razminiranje poljoprivrednog zemljišta, te su Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska izvršile plaćanja obavljenih poslova razminiranja u vrijednosti od 66.425.283,01 kuna.

Osim ovih sredstava koje su županije isplatile ovlaštenim pravnim osobama, ovlaštene pravne osobe su završile poslove razminiranja u vrijednosti od 58.369.643,46 kuna što će im biti isplaćeno kad Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplati sredstva dodjeljene potpore Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

#### **4.1.3. Razminiranje sredstvima Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede) s pozicije Općekorisne funkcije šuma**

Sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma planirano je obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine iz ovog izvora financiranja financirani su poslovi koji su kasnili sa ugovaranjem u 2017. godini, te planirani poslovi za 2018. godinu. Ukupno realizirana sredstva iz ovog izvora iznose 100.625.392,67 kuna.

Naime, utrošena sredstva iz ovog izvora su znatno veća od planiranih iz razloga što je Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta za sredstva OKFŠ-a s Ministarstvom poljoprivrede potpisan tek u rujnu 2017. godine, te je većina sredstava (57.795.991,55 kuna) utrošena u 2018. godini, a temeljem Sporazuma za 2018. godinu utrošeno je 47.829.401,12 kuna.

#### **4.1.4. Ukupno realizirana financijska sredstva**

U Planu protuminskog djelovanja za 2018. godinu za poslove razminiranja planirano je iz svih izvora financiranja 397.777.791,62 kune. Tijekom godine ukupno je za poslove razminiranja realizirano, tj. isplaćeno ovlaštenim pravnim osobama koje su obavljale poslove razminiranja **386.774.317,31 kuna**.

Prosječna cijena razminiranja u 2018. godini iznosila je od 7,92 kn/m<sup>2</sup> (bez PDV-a). Uočljiv je blagi rast prosječne cijene poslova razminiranja u odnosu na prosječnu cijenu poslova u 2017. godini što je posljedica sve težih i nepristupačnijih terena, brdsko-planinskog i šumskog područja, te posebnih mjera zaštite biljnog i životinjskog svijeta za poslove koji se obavljaju u Natura 2000 područjima. Dodatna povećanja cijene očekuju se i u godinama koje slijede.

## 5. Zaključak

Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu planirano je izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površini od 56,5 km<sup>2</sup>.

**Ukupno smanjenje minski sumnjivog područja u 2018. godini iznosi 56 km<sup>2</sup>, od čega je poslovima razminiranja smanjen MSP za 48,8 km<sup>2</sup>, a tehničkim i općim izvidom za dodatnih 7,2 km<sup>2</sup>.**

Od osiguranih sredstava prilikom donošenja Plana u 2018. godini, koja su ukupno iznosila 397.777.791,62 kuna, realizirano je 386.774.317,31 kn.

Nastavlja se uspješan trend prijašnjih godina glede osiguranja sredstava za razminiranje iz EU fondova, tako da ista u 2018. godini iznose 36,8% od ukupno osiguranih financijskih sredstava i izvora. Navedenom iznosu treba pribrojati i dodatni iznos od 58.369.643,46 kuna koji je planiran i realiziran tijekom 2018. godine iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, no nažalost do kraja godine nije isplaćen izvoditeljima. Nastavno bi postotak osiguranih sredstava iz EU fondova za 2018. godinu iznosio 51,9 % od ukupnih sredstava.

Također, sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma planirano je obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2017. godine iz ovog izvora financiranja nije utrošeno ništa iz razloga što je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje potpisan tek 14. rujna 2017. godine tako da se u 2018. godini realizirali projekti iz 2017. i 2018. godine, što je rezultiralo sa 26% sa ove pozicije, od ukupno utrošenih financijskih sredstava u 2018. godini.

Neispunjenje Plana u dijelu smanjenja MSP-a općim i tehničkim izvidom uvjetovano je nedovoljnim kapacitetima (plan rađen na osnovi 60 pirotehničara) jer je nakon integracije Mungos razminiranja u HCR došlo do odlaska 29 pirotehničara, koji su zbrinuti sukladno Zakonu o radu i odluci Vlade RH. Osim nedovoljnih ljudskih kapaciteta podbačaj plana dogodio se i zbog nemogućnosti korištenja strojeva na planiranim projektima jer su tvrtke, sa kojima su sklopljeni okvirni sporazumi za ovu uslugu, koristile strojeve na projektima razminiranja na kojima su radile.

Tijekom obavljanja poslova razminiranja **pronađeno je i uništeno 979 komada MES-a i 1.409 komada NUS-a**. Najviše MES-a i NUS-a, 1.039 komada pronađeno je i uništeno na području Ličko-senjske županije.

Na dan 31. prosinac 2018. godine minski sumnjivo područje je obilježeno s 12.280 tabli ili s 34 table/km<sup>2</sup>, što predstavlja 15% povećanje obilježenosti po km<sup>2</sup> minski sumnjivog područja u odnosu na 2017. godinu.

**U 2018. godini nije se dogodio niti jedan minski incident, niti jedna minska nesreća što je najvažnije ostvarenje Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu.**

U skladu s planiranim za 2018. godinu obavljane su edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a.

## 6. Prilozi

## 6.1. Prikaz razminiranih područja u 2018. godini po županijama

Red. Broj	Županija	Naziv idejnog plana	Razminirano (potvrda) m <sup>2</sup>	
1.	BP	Područje Priporac, sjeveroistočno od Širinaca	140.668	
2.		Područje G.J. Južni Psunj između Ivanovca i Širinaca	92.312	
3.	KA	Šumske površine na području Ličke Jesenice	253.204	
4.		Šumske površine u G.J. Makovnik 2. dio	355.387	
5.		G.J. Makovnik, odjel 14A	436.054	
6.		Šumske površine u općini Saborsko	355.370	
7.		Cjelokupni MSP na području općina Barilović i Generalski Stol	533.302	
8.		Površine uz rijeku Tounjčicu	89.960	
9.		Površina na području Općine Rakovica	106.565	
10.		Područje u naselju Rakovica i uz obalu rijeke Korane u naselju Koranski Lug	70.903	
11.		Površine na području općina Josipdol i Plaški	311.705	
12.		Površine na području naselja Cetingrad	112.705	
13.		Šumske površine u G.J. Makovnik 3. dio	613.603	
14.		LS	Odjeli 19 a i 20 a u G.J. Božin vrh	668.702
15.			Šumske površine u G.J. Makovnik 1. dio	189.658
16.	Poljoprivredne površine između naselja Lički Ribnik i Ornice		4.146.246	
17.	Područja u zaselcima Lipova Glavica i Štimci		266.802	
18.	Poljoprivredne površine na području Tromeđe i Bliznice te u naselju Jurkovići		1.749.814	
19.	Područje naselja Divoselo i Jasikovac u Gradu Gospić		321.432	
20.	Područje zagađeno NUS-om u naselju Bjelopolje		28.249	
21.	Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 2. dio		845.637	
22.	Područje uz državnu granicu s BiH u naselju Željava, 3. dio		75.160	
23.	Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić		27.790	
24.	Područje uz državnu granicu sa BIH u naselju Željava, 4. dio		26.932	
25.	Područje zagađeno NUS-om u naselju Oraovac		25.226	
26.	Šire područje Grada Gospića		358.371	
27.	Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava		2.430.067	
28.	Ukupni MSP zagađen kazetnim streljivom u gradu Gospiću		239.546	
29.	Područje Brakusove Drage i uz spilju Bezdenjača		277.214	
30.	Poljoprivredne površine u naseljima Glibodol, Dabar i Glavace	720.746		

31.		Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava, 2. dio	1.877.346
32.		Površine uz županijsku cestu ŽC 5113 na dijelu dionice Glibodol-Lička Jesenica, 2. dio	57.637
33.		Poljoprivrede površine u naselju Donji Vaganac	1.167.209
34.		Odjel 16B u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	294.863
35.		G.J. Božin vrh, odjel 15A	693.265
36.		Područje zagađeno kazetnim streljivom u naseljima Studenci i Glibodol	280.024
37.		Odjeli 16A u G.J. Božin vrh	680.026
38.		Poljoprivredne površine u naseljima Barlete i Bilaj	1.541.424
39.		G.J. Lisac-Staparuša, odjel 13a	235.284
40.		Poljoprivredne površine na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun	504.299
41.		G.J. Lisac-Staparuša, odjel 14a	307.016
42.	OB	Minska polja na području JU Park prirode Kopački rit	1.248.522
43.		Područje ribnjaka i šumska površina u Općini Šodolovci	382.219
44.		Preostali MSP u općini Antunovac	14.750
45.		Inundacijski pojas rijeke Drave uz granicu s Mađarskom, 2. dio	66.957
46.	PS	Šume na području:Obješenjak, Čivčincac, Pećinsko brdo, Ovtak i Badnjašica	360.512
47.		Šumske površine uz naselje Kusonje	593.721
48.		Šume na području Brezovog polja i Čungara	416.403
49.		Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije	3.710.073
50.		Šumske površine uz naselja Donja Šumetlica i Branešci	849.397
51.		Širi prostor prosjeka i putova na području Ciceľj	199.558
52.		Šume na području Ciceľja	788.808
53.		Šumski odjeli 99,101 i 109 u G.J.Sjeverni Psunj-Javorovica	56.189
54.	SM	Poljoprivredne površine uz naselja Gradusa Posavska i Brđani -Cesta	490.474
55.		Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor	1.372.060
56.		Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području općine Dvor, 3.dio	49.187
57.		G.J. Grede-Kamare, 3. dio	157.644
58.		G.J. Grede-Kamare, 2. dio	147.605
59.		Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 2. dio	2.513.834
60.		Šumske površine u naselju Novo Selište	170.527
61.		Područje Plavnika, Batinić Poloja i Košutarice	185.353
62.		Površine na području naselja Madžari	19.354
63.		G.J. Grede-Kamare, 1. dio	154.172
64.		Područje oko nerazvrstane ceste Gore-G.Mokrice	10.241
65.		Područje naselja Zalaj u Gradu Glina	789.853

**Izvešće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu**

66.		Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 4. dio	18.164
67.		G.J. Grede Kamare, 4. dio	428.254
68.		Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac	3.191.068
69.		Poljoprivredne površine u naselju Kobiljak u Općini Dvor	559.349
70.		Poljoprivredne površine na području naselja Mažari	126.602
71.		Kotar šuma, područje Stari Gaj	1.068
72.		Šumski odjeli 15,20,22,23 i 31 u G.J.Rajičko brdo	320.702
73.		Površina u naselju Gornje Mokrice na području Grada Petrinje	136.455
74.		Livade i šume na području naselja Mažari, Komarevo, Blinjski Kut i Bestrna	1.351.807
75.		Šumske površine u Gornjem Viduševcu, zaselak Pariz	61.370
76.	SD	Područje vojarne "Korešnica" sektor B	43.020
77.		Područje zaselka Dragići u gradu Vrlici	94.195
78.		Područje vojarne "Korešnica" sektor C	44.490
79.		Površine na području Malinjaka	293.755
80.	ŠK	Površine na području Mirlović polja	267.161
81.		Šumski odjeli 17B i 17D u G.J. Guduča	199.195
82.		Šumski odjel 16A u G.J. Guduča	518.032
83.		Šire područje grada Drniša	458.464
84.		Područje južno od naselja Ždrapanj	396.410
85.		Područje G.J. Guduča, zapadno od Sonkovića	664.070
86.		Površine onečišćene kazetnim streljivom na području Šibensko-kninske županije	39.139
87.		Područje naselja Zaton i naselje Jursi u Šibeniku	108.950
88.	ZD	Područje naselja Ždrilo u općini Posedarje	42.341
89.		Područje zaselka Klarići u naselju Bila Vlaka	42.245
90.		Područje zaselaka Grgorići i Narandžići u Općini Novigrad	71.610
91.		Područje Umac u naselju Pristeg	571.579
92.		Područje Pinturove jare u naselju Pristeg	521.556
<b>UKUPNO</b>			<b>48.826.187</b>

**6.2. Izvešće o provedbi Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA  
VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA  
I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA  
ZA 2018. GODINU**

**Zagreb, travanj 2019.**

## 1. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2018. godini provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske (Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske) u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2018. godini.

## 2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2018. GODINI

U 2018. godini provedeno je ukupno sedam zadaća razminiranja od kojih je pet bilo planskih, a dvije izvanplanske.

Razminiranje je provedeno na području dviju vojarni i tri vojna poligona.

Na provedbi tih zadaća provedeno je ukupno 237 radnih dana u kojima je ostvareno 40 240 č/h rada ljudi, 223 m/h rada strojeva te 8 915 km rada vozila.

Vrsta lokacije	broj vojnih lokacija / radova	vrijeme provedbe [r/d]	rad ljudi [č/h]	rad strojeva [m/h]	rad vozila [km]
vojarnе	2/2	141	28 224	188	4 740
poligoni	3/5	96	12 016	35	4 175
<b>UKUPNO</b>	<b>5/7</b>	<b>237</b>	<b>40 240</b>	<b>223</b>	<b>8 915</b>

Pri tome je razminirana površina od 185 416 m<sup>2</sup>, te je pronađeno, uklonjeno i uništeno 16 komada protupješačkih mina i 12 komada raznih neeksplozivnih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene.

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja u 2018. godini iznosio je 465.433,49 kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.066.453,46 kuna.

Vrsta lokacije	razminirana površina [m <sup>2</sup> ]	uklonjeno PPM [kom]	uklonjeno POM [kom]	uklonjen o NUS [kom]	financijski troškovi postrojbe [kn]	ukupni financijski troškovi [kn]
vojarnе	127 091	0	0	12	337.139,76	1.456.101,45
poligoni	58 325	16	0	0	128.293,73	610.352,01
<b>UKUPNO</b>	<b>185 416</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>465.433,49</b>	<b>2.066.453,46</b>

## 2.1. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U SKLADU S PLANOM RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2018. GODINI

Plan razminiranja vojnih objekata za 2018. sadržavao je devet radova na šest vojnih lokacija. Projektna veličina minski sumnjive površine za razminiranje u 2018. godini bila je oko 1 140 000 m<sup>2</sup>.

S provedbom plana započeto je 25. siječnja 2018., a završeno 21. prosinca 2018.

Provedeno je pet radova razminiranja na četiri lokacije, od kojih su dvije zadaće provedene u cijelosti, a tri su započete i s njihovom provedbom nastaviti će se u 2019. godini.

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana provedeno je u ukupno 231 radni dan tijekom kojih je ostvareno 39 344 č/h rada, 213 m/h rada te prijedeno 8 310 km puta s vozilima.

Vrsta lokacije	broj vojnih lokacija/radova	vrijeme provedbe [r/d]	rad ljudi [č/h]	rad strojeva [m/h]	rad vozila [km]
skladišta	1/1				
vojarne	2/2	141	28 224	188	4 740
poligoni	2/5	90	11 120	25	3 570
strelišta	1/1				
<b>UKUPNO</b>	<b>6/9</b>	<b>231</b>	<b>39 344</b>	<b>213</b>	<b>8 310</b>

Ukupno je razminirana površina od 158 955 m<sup>2</sup> te je uklonjeno i uništeno 16 komada protupješačkih mina i 12 komada ostalih neeksploziviranih ubojnih sredstava, a protuoklopne mine nisu pronađene. Trošak provedbe zadaća iz Plana bio je 2.003.954,81 kuna od čega je izravni trošak postrojbe 444.775,21 kuna.

Vrsta lokacije	razminirana površina [m <sup>2</sup> ]	uklonjeno PPM [kom]	uklonjeno POM [kom]	uklonjeno NUS [kom]	financijski troškovi postrojbe [kn]	Ukupni financijski troškovi [kn]
skladišta						
vojarne	127 091	0	0	12	337.139,76	1.456.101,45
poligoni	31 864	16	0	0	107.635,45	547.853,36
vježbališta						
<b>UKUPNO</b>	<b>158 955</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>444.775,21</b>	<b>2.003.954,81</b>

### 1.1. Provedene zadaće iz Plana:

- Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ – Slunj  
(zamjena oštećenih oznaka upozorenja na minsku opasnost (table i trake) oko minski sumnjivih površina)

- Vojarna „Pukovnik Marko Živković“ Pleso, Velika Gorica, (razminiranje površine oko skladišta UB-1 i UB-2).

## 1.2. Zadaće iz Plana koje se nastavljaju u 2019. godini

- Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ – Slunj (razminiranje MSP-a oko repetitora na području objekta Čatrnja)
- Inženjerijski poligon „Cerovac“ – Karlovac (tehnički izvid segmenta „E“)
- Vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ – Zemunik Donji (razminiranje dijela vojarne SEGMENT „D1“).

## 2.2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA IZVAN PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

U 2018. godini provedene su dvije zadaće razminiranja koje nisu bile obuhvaćene Planom razminiranja.

Zadaće su provedene na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ u Slunju i „Gašinci“ u Đakovu za potrebe organizacije i provedbe zajedničke vojne vježbe „VELEBIT 18“.

Zadaće su provedene u trajanju od šest radnih dana u kojima je ostvareno 896 č/h rada ljudi, 10 m/h rada strojeva i 605 km rada vozila.

Vrsta lokacije	broj vojnih lokacija/radova	vrijeme provedbe [r/d]	rad ljudi [č/h]	rad strojeva [m/h]	rad vozila [km]
poligoni	2/2	6	896	10	605
<b>UKUPNO</b>	<b>2/2</b>	<b>6</b>	<b>896</b>	<b>10</b>	<b>605</b>

U sklopu zadaće pregledana je površina od ukupno 26 461 m<sup>2</sup>, a nije pronađeno niti jedno ubojno sredstvo.

Trošak stvoren provedbom ovih zadaća je 20.658,28 kuna za trošak postrojbe, odnosno 62.498,65 kuna ukupnog troška.

Vrsta lokacije	razminirana površina [m <sup>2</sup> ]	uklonjeno Ppm [kom]	uklonjeno P Om [kom]	uklonjeno NUS [kom]	financijski troškovi postrojbe [kn]	ukupni financijski troškovi [kn]
poligoni	26 461	0	0	0	20.658,28	62.498,65
<b>UKUPNO</b>	<b>26 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.658,28</b>	<b>62.498,65</b>

U 2018. godini provedene su i sljedeće neplanirane zadaće:

- dopunski opći izvid protuoklopnog strelišta „Koturevo“ i strelišta za tenkovska gađanja „Tuk“ na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju

- tehnički izvid područja strelišta za POVRS za potrebe provedbe zajedničke vojne vježbe „VELEBIT 18“ na vojnom poligonu Gašinci, Đakovo.

### **3. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA U 2018. GODINI**

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja u 2018. godini iznosio je 465.433,49 kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.066.453,46 kuna.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća ima obveze sudjelovanja u obukama i vježbama, unutarnoj i stražarskoj službi, stručnim usavršavanja djelatnika odavanju počasti kod pokopa hrvatskim braniteljima i drugim zadaćama.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja u mogućnosti je osigurati angažman tri voda istovremeno odnosno provoditi najviše tri zadaće u nekom presjeku vremena.

### **4. ZAKLJUČAK**

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi planskih i izvan planskih radova razminiranja angažirale za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno koristeći dostupne resurse.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na sve obveze postrojbe tijekom 2018. godine ostvaren je realan učinak.

Prioritet angažiranja bio je na razminiranju minski sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Marko Živković“, Pleso i vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji te na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ i „Gašinci“.

Udio neplaniranih zadaća bio je zadovoljavajući, a iznosio je u odnosu razminiranih površina svega 14,27 % te u odnosu ostvarenih troškova 3,02 %.

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina provedeni su na uspješan i učinkovit način bez ijednog izvanrednog događaja, što prvenstveno ukazuje na dobru obučenost i dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.
